


RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE ANNO 2021

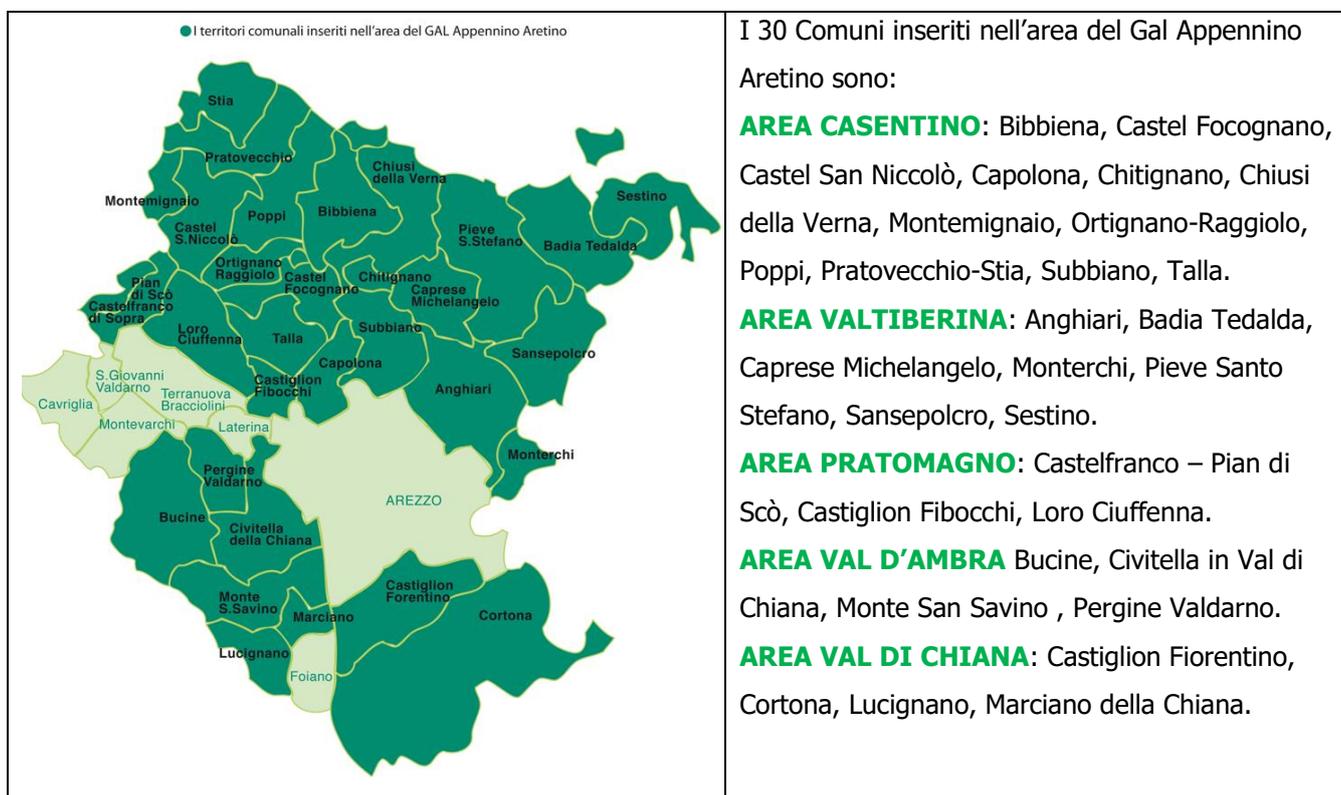

Sommario

1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	3
2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE.....	3
2.1 Informazioni generali e contatti.....	3
2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto	4
2.3 Partenariato.....	8
2.4 Atto costitutivo/Statuto.....	8
2.4.1 Attività organi statutari.....	8
2.5 Struttura organizzativa	9
2.6 Acquisizione di competenze	9
3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	11
3.1.Sintesi delle principali difficoltà.....	16
4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2021	18
4.1 Stato di attuazione finanziario	18
4.1.1 OSSERVAZIONI.....	26
4.2 Avanzamento procedurale	27
4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale.....	40
5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2020	40
5.1 Spese non rendicontabili.....	44
6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	45
6.1 Animazione sul territorio	45
6.2 Pubblicità degli interventi	46
7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	52
8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	53
9.MONITORAGGIO	53
10.VALUTAZIONE.....	54
Allegati.....	54

1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	http://www.galaretino.it/strategia-di-sviluppo-locale-sisl/sisl-2014-2020
---	---

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE	Consorzio Appennino Aretino a r.l.
-----------------------------------	------------------------------------

2.1 Informazioni generali e contatti	
Denominazione	Consorzio Appennino Aretino
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Superficie coperta	2.532,08 Kmq
Popolazione	166.711 (Fonte: Istat Gennaio 2021)
Tipologia di territorio	Montano/rurale
Anno di costituzione	1997
Sede legale	Viale Dante Alighieri,74/q
Sede operativa	Viale Dante Alighieri, 74/q
Eventuali altre sedi	
Codice fiscale	01545210518
Partita IVA	01545210518
Telefono	0575/48267
Fax	_____
Sito Internet	www.galaretino.it
Email	info@galaretino.it
PEC	info@pec.galaretino.it
Rappresentante legale	Sassoli Sandro
Direttore	Molli Rita

Sono intervenute variazioni rispetto all'annualità precedente?

NO

SI

Descrivere le variazioni intervenute e le motivazioni che ne hanno determinato la modifica	
--	--

Classificazione dei Comuni inseriti nel territorio del GAL

Comune	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi di sviluppo
Anghiari		X	
Badia Tedalda			X
Bibbiena			X
Bucine		X	
Capolona*	X		
Caprese Michelangelo			X
Castel Focognano			X
Castelfranco * Pian di Scò	X		
Castel San Niccolò			X
Castiglion Fibocchi		X	
Castiglion Fiorentino	X		
Chitignano			X
Chiusi della Verna			X
Civitella in Val di Chiana	X		
Cortona		X	
Loro Ciuffenna			X
Lucignano	X		
Marciano della Chiana	X		
Montemignaio			X
Monterchi		X	
Monte San Savino	X		
Ortignano Raggiolo			X
Pergine Valdarno	X		
Pieve Santo Stefano			X
Poppi			X
Pratovecchio e Stia			X
Sansepolcro	X		
Sestino			X
Subbiano			X
Talla			X
TOTALE			

2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto

Il territorio del GAL Appennino Aretino comprende 30 dei 36 Comuni della provincia di Arezzo, dei Comuni inseriti nell'area Leader ben 16 sono classificati D "aree rurali con problemi di sviluppo", 5 sono classificati C2 "aree rurali intermedie in declino" e 9 sono classificati C1 "aree rurali intermedie in transizione". Dall'analisi dei dati aggiornati al 01/01/2020 si confermano le seguenti dinamiche, già in atto nell'ultimo triennio sull'area del GAL.

- La **densità demografica** dell'area del Gal è di 67 abitanti a Km²: 16 Comuni hanno una densità inferiore alla media dell'area, e dei 14 rimanenti metà ha una densità inferiore alla media provinciale (106 abitanti a Km²) e l'altra metà di poco superiore alla media provinciale, ma comunque inferiore a quella regionale (162

abitanti a Km²) fatta eccezione per Castelfranco-Piandiscò e Sansepolcro che superano di poco il dato toscano. Ben 4 Comuni hanno una densità molto bassa (inferiore a 20) tra cui spicca Badia Tedalda con 9 abitanti a Km² e altri 4 Comuni con una densità inferiore a 30.

- La **popolazione residente** nel territorio del GAL è pari a 169.990 abitanti (sono compresi anche i residenti del Comune di Laterina che a seguito della fusione con il Comune di Pergine ha raddoppiato i suoi residenti) che rappresentano quasi la metà della popolazione residente in provincia di Arezzo e il 4,58% di quella Toscana. La distribuzione della popolazione all'interno del Gal, in riferimento alle varie tipologie di aree, dimostra come nei Comuni D risiede ben il 31,50% a cui si aggiunge il 24,18% della popolazione che risiede nei Comuni C2 mentre il rimanente 44,31% della popolazione si trova nei Comuni C1. La popolazione residente nell'area del GAL continua a diminuire, il decremento ha riguardato tutti i Comuni eccetto i Comuni di Subbiano, Loro Ciuffenna e Castelfranco – Pian di Scò dove si registra un lieve incremento.

- Il **fenomeno dello spopolamento** conferma la tendenza alla diminuzione dei residenti soprattutto nei Comuni D e la concentrazione della popolazione nei centri maggiori e di fondovalle per la vicinanza ai servizi essenziali. La contrazione ha riguardato anche i residenti stranieri, la cui incidenza sulla popolazione totale è diminuita (9,54%) nell'area del GAL al contrario di quanto registrato a livello provinciale (11,11%) e regionale (11,34%).

- Il **fenomeno dell'invecchiamento** della popolazione dell'area del GAL è dovuto all'effetto congiunto della diminuzione della componente giovanile (0-14) a causa della bassa natalità e dell'aumento della componente anziana (oltre 65) per l'allungamento della speranza di vita.

Dagli indici statistici si evidenzia una prevalenza della popolazione più adulta rispetto alla media nazionale e regionale nella classe oltre 65 anni. Tale incidenza è più elevata in alcuni Comuni dell'area Leader, di alcuni piccoli Comuni di Casentino (Castel San Niccolò 30,90% e Montemignaiolo 35,80%) e Valtiberina (Badia Tedalda 32,60% e Caprese Michelangelo 32,90%).

In riferimento alla **situazione economica**, il 2021 si è chiuso con risultati migliori del previsto anche se negli ultimi mesi dell'anno c'è stato un rallentamento causato dall'impennata dei costi energetici e delle materie prime. Grazie all'importante campagna vaccinale del 2021 è stato possibile accelerare il processo di ritorno alla situazione preesistente al periodo emergenziale anche se lo stato di emergenza, previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2022. In generale c'è stata una ripresa che si prevede ancora più sostenuta nel 2022 ma ovviamente, e questo vale per tutte le valutazioni fatte, la conferma delle stime è strettamente conseguente ad una rapida uscita dall'emergenza sanitaria o almeno ad un suo forte contenimento. L'**occupazione**, in passato uno dei punti di forza dell'economia aretina, ha subito un'erosione della base occupazionale ed un incremento dei tassi di disoccupazione fino ad allinearsi ai dati regionali. Il numero di persone in cerca di occupazione risulta dal 2004 ad oggi in costante crescita con incremento esponenziale dal 2009 in poi, sono praticamente raddoppiate negli ultimi dieci anni. Sul fronte dell'occupazione, secondo il rapporto della Camera di Commercio di Arezzo e Siena su elaborazione dei dati Prometeia, nel 2020 le chiusure forzate delle attività hanno lasciato un segno tangibile sulle dinamiche lavorative: se infatti sul fronte degli occupati, grazie anche al blocco dei licenziamenti ed all'ampio ricorso

alla cassa integrazione, la flessione è stata abbastanza contenuta (-0,6%), sul fronte delle unità di lavoro (ULA) la contrazione è ben più elevata (-8,9%). Sulla base dei dati relativi all'indagine ISTAT sulle "Forze di lavoro" nel 2020 gli occupati sono circa 145 mila, per l'80% dipendenti e per il restante 20% indipendenti, e rispetto al 2019 si sono perse quasi 900 posizioni lavorative. L'andamento non è stato però omogeneo, in quanto la crisi occupazionale si è scaricata particolarmente sulla categoria degli occupati indipendenti che sui dipendenti che hanno anche beneficiato di misure emergenziali di protezione.

Il tasso di **disoccupazione** in provincia di Arezzo si è attestato al 7,5% nel 2020, poco al di sopra del 2019 (7,4%) ma un punto percentuale superiore a quello regionale. La stabilità del tasso di disoccupazione, unita alla già evidenziata diminuzione degli occupati e all'invarianza degli attivi danno un'immagine di un sistema del lavoro cristallizzato, sostenuto dalle misure emergenziali di salvaguardia che per il momento frenano in parte l'emorragia che naturalmente sarebbe conseguente ad una crisi di tali proporzioni.

La Cassa Integrazione Guadagni con causale Covid-19 e il blocco dei licenziamenti sono i due strumenti principali utilizzati per cercare di salvare i posti di lavoro. Vista l'entità della crisi è naturale che anche l'entità degli interventi sia stata senza precedenti: nel 2020 sono state circa 21 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Arezzo, quasi 33 volte quelle autorizzate nel 2019. Nella prima metà del 2021 il livello di intervento rimane alto ma su livelli più bassi del 2020, le ore autorizzate diminuiscono di circa l'8%. I dati del Sistema Informativo del Lavoro della Regione Toscana ci permettono di restituire una fotografia aggiornata. Dopo la flessione registrata nella prima metà del 2020 (-28,6%), nel primo semestre 2021 si è assistito ad una ripresa degli avviamenti al lavoro attivati presso i Centri per l'impiego che si è assestata a +26,2% con l'allentamento delle restrizioni indotte dall'emergenza.

Il **reddito delle famiglie** aretine, che nel corso dell'ultimo decennio era cresciuto quasi ininterrottamente, ha subito un forte impatto dalla pandemia: dalle dichiarazioni dei redditi degli aretini l'anno 2020, il primo e più nero del periodo Covid, si registra un pesante passivo del reddito disponibile con una contrazione del 3,2%. In provincia di Arezzo il reddito pro-capite è di 24.483 euro, ad esempio nel Comune di Arezzo si allunga la distanza tra i redditi dichiarati mediamente e la media italiana, inoltre è ben al di sotto della media delle città capoluogo della Toscana, tanto che nella relativa classifica si posiziona al sesto posto. Ben più ampia appare invece la flessione della spesa per consumi finali delle famiglie (-11,4%), sulla quale ha influito in maniera determinante non solo il diminuito potere di acquisto ma anche il diffuso clima di incertezza sulle prospettive future. La riduzione della spesa per consumi, solo in parte giustificata da una contrazione dei redditi, si è trasformata in una crescita della propensione al risparmio: da dati Banca d'Italia nel corso del 2020 i depositi delle famiglie aretine sono infatti cresciuti del 6,3%.

Nella prima metà del 2021 il valore aggiunto dell'industria e delle costruzioni è cresciuto ad un ritmo relativamente sostenuto ma nel secondo semestre sono stati i servizi a trainare la ripresa grazie all'allentamento delle restrizioni e delle misure di distanziamento sociale. Dal lato della domanda, si è verificato un notevole rimbalzo dei consumi e le esportazioni sono cresciute. Il 2021 è anche stato contrassegnato da una ripresa dell'inflazione trainata dall'andamento dei prezzi con il concreto rischio di trasmissione dei notevoli aumenti di prezzo dalla produzione al consumo. Aumenti che hanno inciso

soprattutto in determinati comparti come l'edilizia, settore che è stato agevolato dal "Superbonus 110 per cento" ma che a seguito della grande richiesta ha visto aumentare i costi delle materie prime.

Secondo i dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio al 31 dicembre 2021 il saldo provinciale tra iscrizioni e cessazioni delle **imprese** aretine è stato pari a +209 unità, anche se non raggiungono i valori pre-pandemia. Nel 2021 in provincia di Arezzo sono nate 1.819 nuove imprese rispetto alle 1.627 dell'anno precedente (+11,8%) mentre le cessazioni sono scese a 1.529 (-11,5%). Nel 2021, così come nel 2020, gli interventi pubblici che hanno accompagnato le sospensioni o le restrizioni all'esercizio di diverse tipologie di attività economiche hanno limitato le chiusure aziendali tanto che le cessazioni di attività rilevate sono il valore più basso degli ultimi dieci anni, pertanto da valutare con cautela.

Analizzando i **settori** di attività si rileva che quelli più significativi presentano tutti il segno negativo: il manifatturiero -2,3% (di cui solo le costruzioni +0,6%), commercio -1,5%, trasporti -3,2% e servizi di alloggio e ristorazione -0,6%. Solo all'interno del vasto comparto dei servizi si riscontrano alcuni segni positivi: servizi di informazione e comunicazione +3,3%, attività finanziarie ed assicurative +2,4%, attività professionale, scientifiche e tecniche 4,4%, servizi alle imprese +2,1%, sanità e assistenza sociale +1,1% e attività artistiche, sportive e di intrattenimento -0,2%. I due principali settori di specializzazione del manifatturiero della provincia di Arezzo, la moda e l'oreficeria, registrano una riduzione del numero delle imprese. Ad eccezione della pelletteria che è stazionaria, le imprese di tutti gli altri comparti nell'ultimo anno sono diminuite in misura più o meno marcata (tessile -6,6%, abbigliamento -1,8%, calzature -6,2%, moda nel complesso -3,1%, oreficeria e bigiotteria -2,8%). Il livello di specializzazione si riflette sull'apertura al commercio estero, infatti i dati relativi al 2021, mostrano che già dall'inizio dell'anno è iniziato il recupero delle perdite subite l'anno precedente e sono aumentate con un picco del 30,9% nel secondo trimestre. Come sempre, la voce principale dell'**export**, i metalli preziosi influenza fortemente l'andamento complessivo della provincia. Questo comparto non solo recupera le pesanti perdite ma si porta ai livelli pre-pandemia mentre la moda nel suo complesso, nonostante il recupero avviato, è lontano dai livelli precedenti la pandemia.

Secondo i dati presentati nella Giornata dell'Economia 2021 promossa dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena l'economia aretina ha subito un pesante contraccolpo a causa dell'emergenza pandemica che si traduce in una perdita del 10,1% del **valore aggiunto** provinciale. La crisi però non ha impattato in misura uguale nei vari comparti: i più colpiti sono stati l'agricoltura (-15,8%) e l'industria (-12,2%). Più contenute le flessioni delle costruzioni (-8,6%) e del terziario (-9%) che oltre ai servizi, comprende anche il commercio e le attività ristorative e del turismo e rappresenta circa il 64% del valore aggiunto complessivo. Le aziende che esportano sono state le prime a ripartire dopo l'emergenza, nel 2020 nonostante la crisi le esportazioni sono cresciute del 24,5% e nel 2021 si sono ulteriormente rafforzate con un incremento del 14,4% rispetto allo stesso periodo. Con la ripartenza si sono create notevoli difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione. Una situazione aggravata dalla richiesta aggiuntiva per ricostituire le scorte esaurite tanto che si è creata una carenza di materie prime disponibili che ha portato un'impennata dei prezzi. Quindi il problema non è stato solo avere un approvvigionamento sufficiente ma

anche gestire i rincari delle materie prime e dei componenti intermedi. Inoltre, secondo i dati della Camera di Commercio, aumentano le difficoltà a trovare personale in quanto il confronto tra domanda e offerta mostra potenziali situazioni di carenza in diversi ambiti essendoci un'offerta formativa complessiva in grado di soddisfare solo il 50% della domanda potenziale.

La risposta alla crisi può essere vista come un'opportunità per accelerare la sostenibilità competitiva come fattore cruciale della resilienza: l'ecosostenibilità e la digitalizzazione, già in grado di influenzare il mercato, assumeranno nei prossimi anni un peso rilevante anche a seguito degli investimenti europei volti alle transizioni green e digitali.

2.3 Partenariato

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2021. L'allegato 1 riporta i dati societari del Gal al 31/12/2021.

2.4 Atto costitutivo/Statuto

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2021

2.4.1 Attività organi statutari

Queste le attività svolte dagli organi statutari :

Assemblea dei soci del

- 18/06/2021 con il seguente odg:

- o Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2020: situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- o Relazione Sindaco Unico;
- o Varie ed eventuali

Consiglio di Amministrazione del

24/02/2021 con il seguente odg:

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Presa atto esiti istruttori e approvazione 3^ graduatoria definitiva delle domande ammesse dell'operazione 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- o Approvazione 2^ scorrimento graduatoria preliminare delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- o Informativa su Scheda "Azione specifica Leader" a seguito approvazione SISL da parte della Regione Toscana;
- o Informativa su valutazione Leader dell'Autorità di Gestione con il coinvolgimento dei GAL;
- o Varie ed eventuali

31/03/2021 con il seguente odg:

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Approvazione graduatoria delle domande ammesse dell'operazione 7.6.1 II fase "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";
- o Approvazione 3° scorrimento graduatoria preliminare delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili del bando 8.6 "Sostegno ad investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- o Dotazione e tempistica di spesa dei fondi relativi al Regolamento di transizione: determinazione utilizzo risorse che saranno assegnate per gli anni 2021 e 2022;
- o Progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2020;
- o Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione Bilancio 2020;
- o Decisione in merito alla richiesta dell'Azienda Agricola Cepina di Susanna e Paola del Cipolla a seguito dell'esclusione dalla graduatoria del bando dell'operazione 6.4.1;
- o Varie ed eventuali.

18/06/2021 con il seguente odg:

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Presa atto esiti istruttori e approvazione 5^ aggiornamento graduatoria definitiva delle domande ammesse dell'operazione 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- o Presa atto esiti istruttori e approvazione 3^ aggiornamento graduatoria definitiva delle domande ammesse e non

- o ammesse dell'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole";
- o Informativa su Progetti di rigenerazione di Comunità: cronoprogramma e fasi del procedimento;
- o Varie ed eventuali

29/09/2021

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Cooptazione membro Cda;
- o Presa atto esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse dell'operazione 7.5 "Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative ...";
- o Misura 19.4 "Sostegno per le spese di gestione e animazione" cofinanziamento soci per copertura estensione programmazione;
- o Approvazione Programmazione Forniture e servizi anno 2021 - 2025 e aggiornamento contratti in essere per collaudo progetti;
- o Informativa su Progetti di rigenerazione di Comunità: cronoprogramma e fasi del procedimento;
- o Varie ed eventuali.

20/10/2021

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Approvazione aggiornamento SISL a seguito estensione periodo di programmazione e approvazione piano finanziario con ripartizione fondi annualità 2021-2022;
- o Approvazione bando azione specifica Leader "Progetto di rigenerazione delle comunità";
- o Varie ed eventuali

23/12/2021

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Approvazione primo scorrimento ed esaurimento graduatoria preliminare delle domande potenzialmente finanziabili dell'operazione 7.5 "Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative ...";
- o Approvazione bandi: 4.1.1 - II FASE "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" e 7.6.1 - III FASE "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";
- o Varie ed eventuali.

2.5 Struttura organizzativa

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2021. L'allegato 2 riporta la struttura tecnica al 31/12/2021

2.6 Acquisizione di competenze

Il GAL svolge un'attività che richiede competenze multidisciplinari e spirito d'iniziativa nell'elaborare soluzioni a problemi complessi in merito ai quali è difficile avere una formazione specifica.

Il personale del GAL Appennino Aretino partecipa, insieme agli altri GAL, a tutte le riunioni con Autorità di Gestione, Settore competente Leader e Artea che sono momenti di confronto e di crescita nell'ambito dell'attività complessiva del PSR. A questi si aggiungono i numerosi incontri operativi con gli altri GAL o con gli uffici regionali territoriali che si sono svolti tutti in web conference per contrastare la diffusione del coronavirus. Inoltre i dipendenti del GAL partecipano regolarmente alle attività formative rese obbligatorie dalla normativa sul lavoro.

Nel 2021, il GAL ha partecipato a corsi di formazione specialistici ed attività formative fruibili a distanza come i webinar della Rete Rurale Nazionale e collaborato all'attività organizzata dalla Regione Toscana con gli incaricati dell'Assistenza Tecnica e della Valutazione del PSR. Tra i corsi "frequentati", ai fini dell'acquisizione delle competenze, si segnalano quelli dedicati esclusivamente ai GAL toscani:

-Corso sulla Comunicazione, realizzato da Regione Toscana con assistenza tecnica e società specializzate del settore, con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini ed ai beneficiari le finalità e le modalità operative degli interventi finanziati dal GAL, creando le condizioni per un accesso trasparente e semplificato ai regimi di sostegno e alla conoscenza dei risultati ottenuti nell'ambito dello sviluppo rurale. Il corso è stato organizzato

in quattro moduli formativi tematici e si è concluso nel 2021 con ultimo modulo sulla comunicazione social; -Laboratorio di progettazione partecipata per l'avvio e l'implementazione di Progetti di rigenerazione delle comunità, un percorso formativo di quattro laboratori organizzato da Rete Rurale Nazionale con Poliste su tecniche di animazione e facilitazione di processi partecipativi per i GAL toscani.

Tra le competenze del GAL, novità della programmazione 2014/2020, c'è l'attività di valutazione che è un percorso finalizzato ad orientare i GAL nell'attività di autovalutazione delle loro performance e dei risultati ottenuti. Il percorso, già avviato nel 2019 e svolto nel 2020 nonostante la pandemia, è nato dalla collaborazione con la Regione Toscana e la società incaricata per l'attività di valutazione dell'intero PSR e per i GAL prevede un cronoprogramma che si sviluppa fino al 2023 con attività di coaching singoli e di gruppo, workshop e focus group. In particolare nel 2021 si è conclusa l'attività di rilevazione che ha coinvolto il GAL, il Valutatore e l'Autorità di Gestione da remoto a causa delle limitazioni conseguenti la pandemia da Covid-19 che si è concretizzata in 2 Workshop, 4 Focus Group e 7 Coaching finalizzati ad intervistare attori locali.

Inoltre nel corso del 2021 l'attività inerente l'azione specifica Leader si è intensificata portando ad una fase operativa che ha visto anche la costituzione dei Gruppi di Lavoro specifici al fine di predisporre bando, criteri di priorità e modulistica per la selezione dei Progetti di Comunità (PdC). I gruppi di lavoro, composti dai tecnici dei GAL, funzionari dell'Autorità di Gestione e consulenti dell'Assistenza Tecnica, hanno lavorato condividendo ogni decisione e producendo documentazione uniforme ma che allo stesso tempo contenesse le particolarità di ogni GAL come ad esempio nella scelta e redazione dei criteri di priorità.

Le strutture tecniche dei GAL, dopo l'acquisizione di competenze a seguito del corso sui processi partecipativi, hanno sperimentato nei gruppi di lavoro le tecniche per un'interazione costruttiva da utilizzare con il proprio territorio.

3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Nella Strategia Integrata di Sviluppo Locale sono stati individuati due ambiti tematici principali:

1. Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali;
2. Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali.

La scelta di ambiti tematici è dovuta proprio alla necessità di collegare misure destinate ad Enti con quelle destinate ad imprese in un unico grande tema Unificante per creare un PROGETTO INTEGRATO. Un territorio, quello del GAL Appennino Aretino, che richiede prima di tutto SOSTEGNO sia ai servizi alla popolazione che allo sviluppo economico locale. Si vuole valorizzare l'esistente, potenziandolo, riqualificandolo ma soprattutto metterlo in rete al fine che le peculiarità degli uni diventino valore aggiunto per gli altri. Per raggiungere questi obiettivi, il GAL Appennino Aretino ha concentrato le risorse su poche misure destinate ad Enti Pubblici mentre per le imprese sono state attivate sei misure con il fine di finanziare tutti i settori economici.

Tema/i catalizzatore/i	Misura/Sottomisura/Operazione attivata/e
AMBITO 1 Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali	Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi"
	Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"
	Misura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"
AMBITO 2 Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali	Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"
	Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"
	Misura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione ... dei prodotti delle foreste"
	Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"
	Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"
	Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

A seguito di riduzioni finanziarie applicate dalla Regione Toscana, sia per la riserva obbligatoria che per il trascinarsi, e non ultimo, il piano di solidarietà a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma, il Piano Finanziario della SISL è stato rimodulato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal, contestualmente anche alla programmazione della prima fase di pubblicazione delle misure nel 2018, e al

secondo semestre 2019 per la seconda fase, in attesa anche della riassegnazione della riserva obbligatoria che prevedeva circa € 663.000,00. La riserva obbligatoria, era stata riservata principalmente alla misura 7.5 e alla Misura di cooperazione 19.3.

Successivamente in data 5 novembre 2019 la Regione ha assegnato la quota di performance ai Gal nello specifico, per il Gal Appennino Aretino € 629.183,98. Il Consiglio di Amministrazione del Gal in data 27 novembre ha approvato la rimodulazione del piano finanziario che ha visto la soppressione della Misura di cooperazione e l'allocazione della riserva alla misura 7.6.1 e 7.5.

Il 17 febbraio 2020 la giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del Gal Appennino Aretino con le suddette rimodulazioni. Intanto il Gal aveva pubblicato a dicembre e prorogati fino a giugno gli ultimi due bandi rivolti agli Enti pubblici quello della misura 7.5 e 7.6.1 II fase le cui dotazioni erano state implementate proprio con la riserva obbligatoria.

Con questi due bandi il Gal ha esaurito la pubblicazione di tutte le misure. Nonostante che da marzo 2020 la situazione pandemica da COVID 19 abbia rallentato tutte le attività economiche quella del Gal non ha subito grandi defezioni. Infatti anche se con un po' di rallentamenti sono state continuate le attività di istruttoria di ammissibilità ma soprattutto di saldo e liquidazione, come evidenziato nei paragrafi che seguono.

Con l'attuazione dei progetti ovviamente è stato possibile anche avere chiare quelle che erano le economie che via via si andavano generando. Infatti per alcune misure le domande sono state quasi del tutto collaudate, altre anche se prorogate sono comunque definitive negli importi. In più ci sono state anche delle rinunce presentate da aziende che visto anche il periodo economico hanno preferito rimandare gli investimenti. Questo ha portato a riformulare a dicembre un nuovo Piano Finanziario approvato dalla DGRT in data 21 dicembre al fine di destinare le economie alle misure.

Anche il 2021 ha visto l'impegno del Gal prevalentemente nell'attuazione e rendicontazione dei progetti, ma anche nel valutare come impiegare le nuove risorse che la Regione Toscana già da marzo aveva indicato di destinare ai Gal; risorse relative alla ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022 e per questo il Gal si è attivato ed operato per la modifica della SISL che ha tenuto conto anche dell'avvio dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità.

Le risorse pari a € 3.063.592,71 sono state definitivamente assegnate con DGRT n.1288 del 6 dicembre 2021 così ripartiti:

- € 2.236.676,73 per la misura 19.2;
- € 826.916,01 per la misura 19.4

Di seguito si riportano schematicamente le Misure attivate dal Gal Appennino Aretino per ciascun ambito tematico con l'ultima dotazione approvata con la Delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021.

Obiettivi raggiunti al 31/12/2021

BANDI EMESSI	Dotazione bando	Rifinanziamenti graduatorie	Totale dotazione bando	Bandi in pubblicazione nel 2022
Operazione 4.1.1	700.000,00	550.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00
Operazione 7.5	349.484,16	342.515,81	692.000,00	
Operazione 7.6.1	1.500.000,00	15.326,54	1.515.326,54	
Operazione 7.6.1 – II fase	1.603.180,09	88.819,93	1.692.000,00	
Operazione 7.6.1 – III fase				1.000.000,00
Operazione 7.6.2	1.399.526,77		1.399.526,77	
Operazione 6.4.1	1.250.000,00		1.250.000,00	
Operazione 6.4.3	330.000,00		330.000,00	
Operazione 6.4.4	340.000,00		340.000,00	
Operazione 6.4.5	330.000,00		330.000,00	
Operazione 8.6	920.000,00	820.541,31	1.740.541,31	
Progetti di Rigenerazione delle Comunità				300.000,00
TOTALE			10.539.394.62	2.500.000,00

Nella tabella sopra indicata risulta evidente che l'attività del Gal è stata molto superiore rispetto anche alla dotazione del piano Finanziario pari a € 9.240.016,75, prima della riassegnazione dei fondi sopra richiamati. Infatti nel 2020 era stato già rimodulato il Piano Finanziario per ben due volte con l'obiettivo di utilizzare le economie che di volta in volta si generano durante l'attuazione dei progetti e destinarle alle aziende o Enti che risultavano nelle graduatorie degli ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, nella misura 7.6.1 II fase, 8.6 e poi la 7.5, in modo da esaurire tutte le graduatorie.

La dotazione totale SISL Misura 19.2 prima della riassegnazione era pari a € 9.240.016,75, pertanto l'avanzamento finanziario al 31/12/2021 in termini di emissione bandi, è del 100%. Inoltre le economie provenienti dalle varie misure a seguito di accertamenti e rinunce sono state spostate quasi interamente alla Misura 7.5 per l'esaurimento della graduatoria e la restante parte alla Misura 4.1.1 II FASE che nel 2022 vedrà la pubblicazione di un nuovo bando.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi agli importi liquidati e quelli ancora da liquidare, in relazione alla dotazione della misura del Piano Finanziario approvato a dicembre 2020 e quello ultimo approvato del 2021. Nel 2021 le economie generatesi a seguito di rinunce e collaudi sono state spostate nelle misura 7.5 la cui graduatoria, con le sole economie, è stata interamente soddisfatta.


BANDI	Importi di domande liquidate anticipo/saldo	Domande ammesse ancora da liquidare *	PF approvato DGRT 1595 del 21/12/2020	PF approvato DGRT 1288 del 06/12/2021
Operazione 4.1.1 - I fase	908.238,00		980.808,82	2.119.356,38
Operazione 6.4.1	188.000,00	632.000,00	979.000,00	820.537,10
Operazione 6.4.3	101.225,59	36.534,00	154.219,59	137.800,00
Operazione 6.4.4	155.000,00	23.350,00	238.333,62	195.000,00
Operazione 6.4.5	180.000,00	9.500,00	304.096,66	190.000,00
Operazione 7.5		332.000,00	349.484,16	692.000,00
Operazione 7.6.1 - I -II	1.328.000,00	1.821.000,00	3.158.000,00	4.150.000,00
Operazione 7.6.2	1.195.000,00	106.000,00	1.335.532,59	1.304.000,00
Operazione 8.6	1.130.000,00	438.000,00	1.740.541,31	1.568.000,00
TOTALE	5.185.463,59	3.398.384,00	9.240.016,75	11.176.693,48

*importo domande aggiornato al netto di rinunce e collaudi

Da segnalare che in tabella come nel grafico non sono stati inseriti gli importi relativi ai tre bandi che saranno pubblicati nel 2022:

- 4.1.1 II FASE - € 1.200.000,00
- 7.6.1 III FASE - € 1.000.000,00
- Azione Specifica LEADER - € 300.000,00

Nel grafico sottostante sono stati riportati i dati della tabella ed è evidente come sia alto lo stato di attuazione e liquidazione dei progetti della SISL.

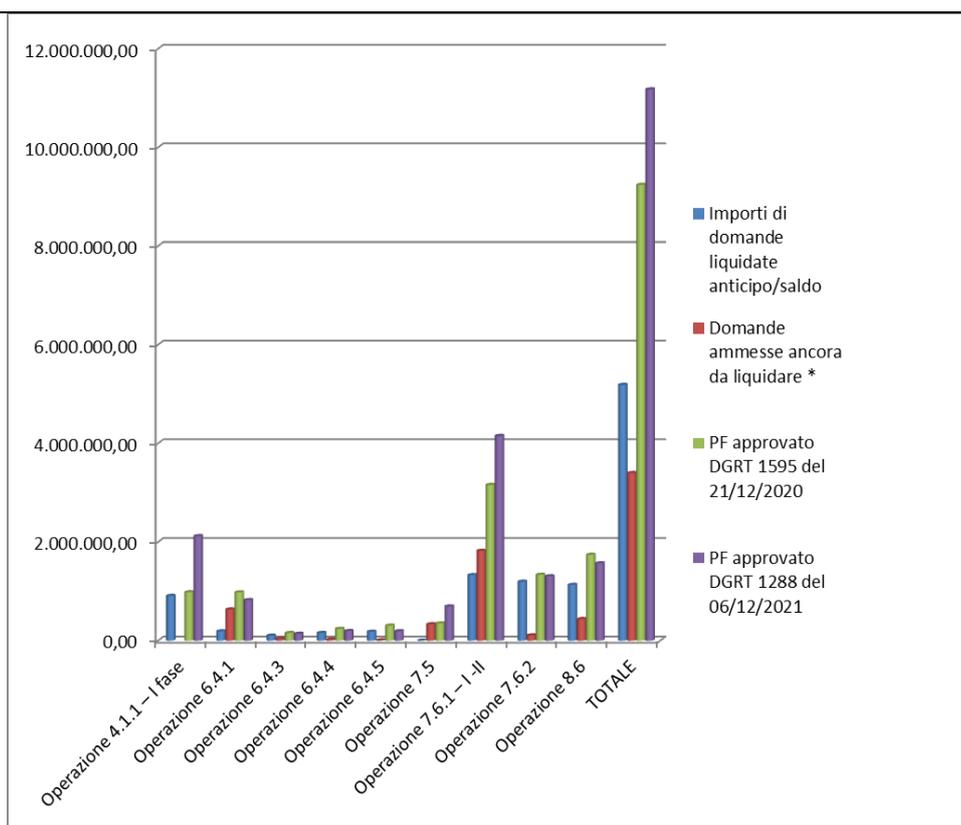

Il 2021 quindi come già detto, ha visto l'impegno del Gal prevalentemente nell'attuazione e rendicontazione dei progetti, ma anche nel valutare come impiegare le nuove risorse che la Regione Toscana già da marzo aveva indicato di destinare ai Gal; risorse relative alla ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022.

Le risorse pari a € 3.063.592,71 sono state definitivamente assegnate con DGRT n.1288 del 6 dicembre 2021 così ripartiti:

- € 2.236.676,73 per la misura 19.2;
- € 826.916,01 per la misura 19.4

Il Gal, tenendo conto anche l'alto avanzamento attuativo, con una liquidazione superiore al 60% delle risorse assegnate ai beneficiari, ha fatto sì che fossero chiare sia le economie che le esigenze del territorio e pertanto ha deciso la pubblicazione di due nuove bandi sulla misura 4.1.1 destinato a soggetti privati e sulla 7.6.1 per Enti Pubblici, oltre che quello per i Progetti di Rigenerazione delle Comunità.

La Misura 4.1.1 "Miglioramento della redditività della competitività delle aziende agricole" è stata scelta considerando che è stato il primo bando pubblicato nel 2018 e che tutte le domande di aiuto ricevute sono state finanziate e gli investimenti conclusi, a differenza delle altre due misure agricole, 6.4.1 e 8.6, che sono in corso di attuazione (Bandi fine 2019, graduatorie 2020 e scorrimento 2021).

La Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi" è la più appropriata per coerenza con la programmazione della SISL, infatti è stata l'esigenza maggiormente manifestata da parte degli enti del territorio per intervenire sui servizi alla popolazione per le piccole località che anche causa pandemia diventano sempre più marginali e dove, i servizi e il miglioramento della vivibilità, devono essere garantiti.

Alla Misura di "Rigenerazione delle Comunità" è stata assegnata una parte delle risorse che risulta inferiore rispetto ai bandi sopra richiamati ma, vista la sua complessità, richiederà molto tempo e soprattutto vuole essere vista come un'attività sperimentale e innovativa che vedrà crescere il "metodo del lavorare insieme" in prospettiva della prossima programmazione.

Con gli altri GAL Toscani a partire dal 2020, insieme alla Regione Toscana e alla Rete Rurale, abbiamo progettato un supporto per la ripresa graduale delle comunità locali maggiormente colpite dalla crisi sociale ed economica. A tal fine a giugno 2020 abbiamo modificato la SISL per integrare le scelte strategiche, contenute nei due ambiti tematici e la loro articolazione in misure riportate nella tabella precedente, con l'inserimento di una nuova sottomisura da attuare con nuove modalità. L'introduzione di questa misura è finalizzata a sviluppare "azioni specifiche", complementari e sinergiche con quella attuate dalle istituzioni e dalle politiche di sostegno, progettando e coordinando interventi complessi ed integrati tra settori produttivi proposti da partenariati. A fine 2020, a seguito di un'intensa attività di confronto e numerose riunioni di verifica, la Regione ha approvato la scheda di Azione Specifica Leader – PdC- "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" condivisa da tutti i GAL toscani.

L'obiettivo è stato quello di intraprendere un percorso, finalizzato alla definizione di una metodologia di progettazione partecipata sulla quale misurarsi con le risorse relative al periodo di transizione.

Il 2021, da giugno e che continuerà anche nel 2022, ha visto l'elaborazione del bando, dei criteri e del formulario. Infatti sono stati costituiti dalla Regione Toscana gruppi di lavori specifici al fine di produrre una soluzione comune a tutti i Gal Toscani. Percorso che si concluderà nei primi mesi del 2022 con la pubblicazione del bando in contemporanea in tutti i territori Gal.

Nel 2021 il Gal ha attivato ovviamente anche l'attività di ascolto del territorio proprio per definire meglio tematismi e, partenariati, attività propedeutiche alla successiva pubblicazione del bando.

Ha organizzato ed ha partecipato ad alcuni incontri e ha promosso un sondaggio tramite il proprio sito web e l'invio alla mailing list di un questionario.

3.1.Sintesi delle principali difficoltà

L'anno 2021 è ricordato anche per l'importante campagna vaccinale che ha consentito di ritornare in presenza al lavoro ma è anche l'anno il secondo anno di pandemia da Covid-19, caratterizzato dalla difficile gestione

dell'emergenza sanitaria e delle conseguenze economiche e sociali che avranno ricadute anche nei prossimi anni.

Per il GAL la principale difficoltà affrontata nel corso del 2021 è stata la lenta ripartenza di tutte le attività a seguito dello stato di emergenza. Il GAL è stato coinvolto sotto tutti gli aspetti: come società ha adottato le misure per contrastare e contenere la diffusione del contagio con l'aumento dei costi e di tempo per le nuove regole in materia di sicurezza sanitaria, come ufficio impegnato a garantire con modalità a distanza l'operatività e l'attuazione del programma Leader.

Le maggiori criticità incontrate dal GAL sono quelle legate alla modifica del modo di lavorare ed all'individuazione di misure idonee a garantire una gestione corretta ed efficiente adeguando specifiche procedure.

Le nuove modalità sono state adottate per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci del GAL, di tutti gli incontri e le riunioni operative, in sintesi tutta l'attività è stata svolta a distanza. Inizialmente questo passaggio è stato complicato e ci ha trovato impreparati ma a distanza di 2 anni si può dire di aver raggiunto una buona organizzazione. A queste difficoltà si sono aggiunte quelle incontrate nell'attuazione della SISL, che sono imputabili alle restrizioni conseguenti l'emergenza sanitaria prima e al distanziamento sociale imposto per la gestione della pandemia successivamente, da parte dei beneficiari che hanno accumulato ritardi generalizzati nella realizzazione degli investimenti finanziati con la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020. Il GAL per andare incontro alle esigenze dei beneficiari ha cercato di essere presente sul territorio, seppur a distanza, telefonicamente e con comunicazioni specifiche su nuove modalità di rendicontazione e, al fine di evitare numerose rinunce ai progetti, verificata la possibilità di realizzare l'investimento, ha istruito ed approvato molte proroghe e varianti alle domande presentate.

Ciononostante, il 2021 si è chiuso con risultati migliori del previsto ma la situazione generale è strettamente conseguente ad una rapida uscita dall'emergenza sanitaria o almeno ad un suo forte contenimento tanto che lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31/03/2022. Nel territorio del GAL, come nelle altre aree, negli ultimi mesi dell'anno abbiamo riscontrato un rallentamento generalizzato delle attività produttive causato dall'impennata dei costi energetici e delle materie prime. Con la ripartenza i beneficiari dei progetti hanno incontrato notevoli difficoltà di approvvigionamento, di gestione dei rincari delle materie prime e dei componenti intermedi e di reperimento personale a seguito dell'aumento della domanda. Anche di fronte a queste difficoltà il GAL, forte dell'estensione della programmazione 2014/2022 concessa dalla Regione Toscana, valutando caso per caso, ha concesso varianti e proroghe per dare la possibilità ai beneficiari di completare gli investimenti finanziati ed al contempo ha programmato nuovi bandi per portare ulteriori risorse a sostegno di un territorio così duramente colpito.

4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2021

4.1 Stato di attuazione finanziario

Misura 19.2. "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017	700.000,00			0		0		0
2018	5.149.526,77	3.599.526,77	672.848,70	0,06		0		0
2019	2.761.306,00	4.464.486,09	3.135.890,19	0,27	133.906,32	0,01	97.364,54	0,01
2020	629.183,98	658.178,16	3.142.378,62	0,27	1.946.732,80	0,17	1.807.249,20	0,15
2021			2.237.553,61	0,19	3.013.010,14	0,26	3.136.333,29	0,27
2022	2.511.118,03			0		0		0
Totale	11.751.134,78	8.722.191,02	9.188.671,12	0,78	5.093.649,26	0,43	5.040.947,03	0,43

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- La differenza fra programmato e messo a bando è riferito alle graduatorie sia della misura 4.1.1 che 7.6.1 II fase che 8.6 che sono state ridotate per soddisfare le domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.
- Nell'anno 2020 sono state inserite le risorse riferite alla performance che sono state destinate ai bandi in essere della 7.6.1 II fase e 7.5 che erano stati pubblicati nell'anno 2019 con delle risorse a condizione che sono state assegnate con DGRT del dicembre 2020
- A dicembre 2021 con l'approvazione del piano finanziario DGRT1288 è stata esaurita la graduatoria del bando 7.5 con le economie che si erano generate dalle altre misure.
- Nell'anno 2022 nel "programmato" sono stati inseriti gli importi relativi ai tre bandi (4.1.1 II fase -7.6.1 III fase – Progetti di rigenerazione delle Comunità) che sono stati dotati sia dalle economie ma prevalentemente dall'assegnazione dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-2022 DGRT 1288/2021.

Stato di attuazione per misura

Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017	700.000,00			0		0		0
2018	550.000,00	700.000,00	672.848,70	0,27		0		0
2019			457.843,27	0,19	133.906,32	0,05	133.906,32	0,05
2020				0	584.037,32	0,24	584.037,32	0,24
2021				0	190.294,71	0,08	190.294,71	0,08
2022	1.211.118,03			0		0		0
Totale	2.461.118,03	700.000,00	1.130.691,97	0,46	908.238,35	0,37	908.238,35	0,37

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 4.1.1 risulta pari a € 2.119.356,38. Nel corso del 2020 infatti le economie che si sono generate con l'attuazione dei progetti hanno permesso di fare delle modifiche al piano finanziario, risulta infatti che il primo bando è stato completato avendo collaudato tutte le domande per l'importo che è riportato nella tabella alla colonna liquidato.
- La differenza tra l'importo programmato e quello messo a bando è relativo alla dotazione del bando II fase, la cui pubblicazione è prevista nel corso dell'anno 2022.

Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	700.000,00			0		0		0
2019	550.000,00	1.250.000,00		0		0		0
2020			966.047,72	0,77	40.123,20	0,03		0,00
2021			62.629,90	0,05	147.867,55	0,12	187.990,75	0,15
2022				0		0		0
Totale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.028.677,62	0,82	187.990,75	0,15	187.990,75	0,15

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.1 risulta pari a € 820.537,10.

Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	330.000,00			0		0		0
2019		330.000,00		0,00		0,00		0,00
2020			154.219,59	0,47	10.573,59	0,03	10.573,59	0,03
2021				0	90.652,00	0,27	90.652,00	0,27
2022				0		0		0
Totale	330.000,00	330.000,00	154.219,59	0,47	101.225,59	0,31	101.225,59	0,31

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.3 risulta pari a € 137.800,00.

Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	340.000,00			0		0		0
2019		340.000,00		0		0		0
2020			238.333,62	0,70	107.656,63	0,32	107.656,63	0,32
2021				0	46.931,99	0,14	46.931,99	0,14
2022				0		0		0
Totale	340.000,00	340.000,00	238.333,62	0,70	154.588,62	0,45	154.588,62	0,45

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.4 risulta pari a € 195.000,00.

Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	330.000,00			0		0		0
2019		330.000,00		0		0		0
2020			304.096,65	0,92	57.425,68	0,17	47.065,68	0,143
2021				0	122.575,73	0,37	132.935,73	0,40
2022				0		0		0
Totale	330.000,00	330.000,00	304.096,65	0,92	180.001,41	0,55	180.001,41	0,55

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.5 risulta pari a € 190.000,00.

Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020	349.484,16	349.484,16		0		0		0
2021	342.515,84	342.515,84	160.049,92	0,23		0		0
2022				0		0		0
Totale	692.000,00	692.000,00	160.049,92	0,23	0,00	0	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Il bando pubblicato il 24/12/2019 e poi prorogato aveva dotazione uguale a zero, le risorse erano infatti quelle della riserva obbligatoria del 6%; La dotazione di €349.484,16 era subordinata alla approvazione da parte della Regione Toscana del Piano Finanziario rimodulato che è avvenuta con DGRT 1595 del 21/12/2020
- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 7.5 risulta pari a € 692.000,00. Sono state spostate le economie necessarie per soddisfare l'intera graduatoria.

Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	1.500.000,00	1.500.000,00		0		0		0
2019	1.291.304,00	1.294.486,09	1.496.819,91	0,39		0		0
2020		308.694,00		0	1.009.931,53	0,27	940.931,53	0,25
2021			1.640.980,65	0,43	258.243,28	0,07	327.243,28	0,09
2022	1.000.000,00	1.000.000,00		0		0		0
Totale	3.791.304,00	4.103.180,09	3.137.800,56	0,83	1.268.174,81	0,33	1.268.174,81	0,33

- Nel "messo a bando - anno 2020" sono state inserite delle economie derivanti dal primo bando, dalle economie derivanti dalla misura 7.6.2 ed alla performance. Dopo la graduatoria preliminare la misura è stata dotata di ulteriori economie per esaurire la graduatoria come approvato con DGRT 1595 del 21/12/2020. La Misura infatti aveva una dotazione finale di € 3.158.000,00 ed ha permesso di soddisfare tutte le domande del secondo bando.
- Successivamente con DGRT 1288 del 06/12/2021 la Misura risulta pari a € 4.150.000,00 e prevede la pubblicazione nel 2022 un nuovo bando.

Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale "

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	1.399.526,77	1.399.526,77		0		0		0
2019			1.181.227,01	0,84		0		0
2020			189.305,57	0,14	136.984,85	0,10	116.984,85	0,08
2021				0	1.057.766,55	0,76	1.077.766,55	0,77
2022				0		0		0
Totale	1.399.526,77	1.399.526,77	1.370.532,58	0,98	1.194.751,40	0,85	1.194.751,40	0,85

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 7.6.2 risulta pari a € 1.304.000,00.

Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste "

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019	920.000,00	920.000,00		0		0		0
2020			1.290.375,47	1,40		0		0
2021			367.814,80	0,40	1.125.034,07	1,22	1.098.678,49	1,19
2022				0		0		0
Totale	920.000,00	920.000,00	1.658.190,27	1,80	1.125.034,07	1,22	1.098.678,49	1,19

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Il Gal a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario DGRT nel gennaio 2020 prima e poi nel dicembre 2020 ha dotato la misura 8.6 delle risorse necessarie per i primi scorrimenti della graduatoria. La misura a dicembre 2020 aveva una dotazione pari a € 1.740.540,31. Successivamente, esaurita nel 2021 tutta la graduatoria ha visto delle economie che sono state spostate ad altre misure.
- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 8.6 risulta pari a € 1.568.000,00.

4.1.1 OSSERVAZIONI

L'anno 2021, come riportato nelle tabelle relative allo stato di attuazione per misura, evidenzia che l'attività si è concentrata prevalentemente sulla attuazione e rendicontazione dei progetti.

Da rilevare il 2 agosto 2021 è stato approvato da parte della Regione Toscana con Delibera di Giunta n.784 il nuovo termine per le scadenze attuative dei progetti.

Questo, visto il "triste" periodo che ha caratterizzato quasi due anni di attività, ha dato la possibilità di concedere delle proroghe sia agli Enti che alle aziende in modo da non obbligare necessariamente l'esecuzione di investimenti privilegiando solo la temporalità.

Da rilevare inoltre che il 6 dicembre, ma con un percorso già avviato da marzo, è stata approvata la modifica alla Strategia Integrata di Sviluppo Locale con il Piano Finanziario rimodulato sia delle economie ma in particolare con la ripartizione dei fondi degli anni 2021 e 2022 come già descritto nei paragrafi precedenti.

L'assegnazione delle risorse di transizione pari a € 3.063.592,71 sono state definitivamente assegnate con DGRT n.1288 del 6 dicembre 2021 così ripartiti:

- € 2.236.676,73 per la misura 19.2;
- € 826.916,01 per la misura 19.4

Il Consiglio di Amministrazione del Gal già ad ottobre aveva stabilito i principi di ripartizione delle risorse e delle economie nel seguente modo:

- di destinare **le economie circa 535.000,00:**
 - allo scorrimento della graduatoria del bando 7.5;
 - le restanti ai bandi che saranno pubblicati nel 2022 relativi alla misura 7.6.1 III fase e 4.1.1 II fase;
- di assegnare **le risorse aggiuntive** relative ai fondi annualità 2021-2022 nel seguente modo:
 - €300.000,00 all'Azione specifica LEADER;
 - €968.338,37 al bando della misura 7.6.1 II fase;
 - €968.338,37 al bando della misura 4.1.1 II fase ;

Nella tabella che segue sono stati inseriti i diversi "spostamenti" che hanno portato ad altrettante approvazioni da parte della Regione Toscana del Piano Finanziario. Le modifiche infatti hanno dato la possibilità in funzione delle economie che si generavano con l'attuazione dei progetti, di esaurire tutte le graduatorie e poter destinare le risorse ai nuovi bandi nel 2022.

Misura	Dotazione Piano Finanziario Febbraio 2020	Dotazione Piano Finanziario Dicembre 2020	Dotazione Piano Finanziario Dicembre 2021
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	1.003.808,82	980.808,82	2.119.356,38
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	1.346.890,34	979.000,00	820.537,10
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	154.219,59	154.219,59	137.800,00

6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	238.333,62	238.333,62	195.000,00
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	304.096,66	304.096,66	190.000,00
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	349.484,16	349.484,16	692.000,00
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	3.100.000,00	3.158.000,00	4.150.000,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	1.370.532,59	1.335.532,59	1.304.000,00
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	1.372.650,97	1.740.541,31	1.568.000,00
Azione specifica LEADER			300.000,00
TOTALE	9.240.016,75	9.240.016,75	11.476.693,48

4.2 Avanzamento procedurale

Si riporta una descrizione dello stato di avanzamento procedurale con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione con relativo schema di sintesi:

Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

Il bando pubblicato in data 18/01/2018 e chiuso il 19/03/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte delle aziende agricole del territorio del Gal.

Hanno presentato domanda ben 58 imprese di cui 56 ammissibili (due aziende infatti avevano presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.405.617,76, di queste ne sono risultate ammissibili potenzialmente nella prima graduatoria preliminare solamente 30 per un 'importo pari a € 693.317,20 vista la dotazione iniziale del bando.

A seguito delle verifiche istruttorie, a giugno 2018 delle 30 domande ne sono risultate finanziabili 25, 1 è stata riposizionata e 4 sono state respinte perché non ammissibili.

A giugno pertanto è stato approvato il primo scorrimento che ha visto potenziali ulteriori 4 aziende che a settembre sono state ammesse. Per un totale di 29 domande ammesse.

Sempre a settembre a seguito della rimodulazione e accorpamento delle dotazioni riferite alla prima e seconda fase c'è stato il secondo scorrimento della graduatoria che ha visto diventare potenziali ulteriori 19 aziende. Successivamente sono arrivate due rinunce ed a novembre è stato approvato il 3° scorrimento della graduatoria con le ultime 4 aziende esauendo così tutte le domande presentate.

A gennaio 2019 sono state istruite tutte le domande, concludendo l'intera graduatoria che ha visto complessivamente: l'ammissibilità di 48 aziende, di cui 6 hanno rinunciato post sottoscrizione del contratto,

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

3 hanno rinunciato durante l'istruttoria e 5 sono state le respinte. Il 2020 ha visto la presentazione di una rinuncia così che le aziende beneficiarie complessive risultano 41 di queste hanno presentato domanda di saldo 26 nel 2019 e 13 nel 2020. Nel 2020 sono stati emessi 25 elenchi di liquidazione a saldo per oltre 580.000,00€ tutti liquidati entro l'anno da ARTEA.

Nel 2021 sono state presentate le domande di saldo delle ultime due aziende presenti in graduatoria. Questo ha permesso di esaurire tutte le 41 domande, avendo emesso le ultime due liquidazioni erogando complessivamente € 908.238,35.

Nel 2022 è prevista la pubblicazione di una seconda fase relativa a questa Misura con una dotazione di oltre €1.200.000,00.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	58	1.522.915,22
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	48	1.130.691,97
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	2	36.537,54
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	41	871.700,81

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"



Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €1.250.000,00. La partecipazione è stata numerosa, superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare questo bando in primis e poi anche quello della Misura 8.6 con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure. Il 17 febbraio 2020 con Delibera n.183 la Regione ha approvato la rimodulazione del Piano finanziario del Gal Appennino Aretino, che prevedeva per la misura 6.4.1 una dotazione pari a € 1.346.890,34. E' stata quindi approvata a marzo 2020 la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili che ha visto ammissibili 39 domande per €1.346.890,34 (un'impresa aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima).

A seguito dell'istruttoria ad agosto 2020 è stata approvata la prima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità di 34 aziende per € 1.128.487,74 , 2 aziende hanno comunicato la rinuncia a portare avanti l'investimento, 2 sono state escluse per mancanza requisiti di accesso ed 1 è stata sospesa in quanto con documentazione da integrare. Il 9 dicembre 2020 è stata approvata l'aggiornamento della graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità dell'azienda che era stata sospesa, la rinuncia volontaria post ammissibilità di 5 aziende. Questo ha portato alla rimodulazione del piano finanziario di dicembre che ha visto la Misura 6.4.1 con una dotazione ridotta pari a € 979.000,00. L'anno 2020 pertanto vede la stipula di 30 contratti (da sottrarre 1 azienda che ha rinunciato post sottoscrizione).

Nel 2021 sono stati stipulati gli ultimi due contratti di cui uno a seguito di un supplemento istruttorio supportato anche da parere legale che ha visto la riammissione di un'azienda che inizialmente era stata esclusa dalla graduatoria. Nel 2021 sono stati richieste 5 domande di anticipo tutte liquidate per €97.363,73 e 11 domande di saldo , sono stati emessi elenchi di liquidazione per 5 aziende mentre 5 sono ancora in istruttoria. Per un totale liquidato di € 50.503,82. Un'azienda che aveva presentato il saldo a seguito del controllo in loco è stata respinta perché non è stata inserita in elenco di liquidazione in quanto l'applicazione della sanzione prevista dall'art.63 Reg.UE809/2014 superava il contributo ammesso. Purtroppo gli effetti della crisi si sono visti anche nell'attuazione di questa misura, infatti sono state presentate ben 3 rinunce.

Ad oggi risultano pertanto ammesse 27 aziende per circa € 820.000,00. Le economie sono state spostate nel Piano Finanziario approvato a dicembre 2021.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	40	1.346.890,34
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	36	1.181.369,92
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	7	137.486,93
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	5	50.503,82

MISURA 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"



Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione è stata scarsa, visti anche i vincoli presenti nei bandi, ma sicuramente sotto le aspettative.

Hanno presentato domanda 8 imprese di cui 7 ammissibili (un'azienda aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima) pari a € 155.436,00.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 7 aziende. Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti da parte delle 7 aziende beneficiarie per € 154.219,59. Sono state presentate due domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per € 10.573,59.

Nel 2021 hanno presentato il saldo 3 aziende e sono state inserite in liquidazione e pagate per € 90.652,00, è arrivata la richiesta di una rinuncia e l'ultima azienda, che conclude la graduatoria ha presentato la domanda di saldo il 15 dicembre. Anche di questa misura le economie sono state spostate nel Piano finanziario approvato a dicembre che vede la misura con una dotazione complessiva di € 137.800,00.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	161.294,71,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	7	154.219,59
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	5	101.225,59

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"



Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €340.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa.

Hanno presentato domanda 24 imprese per un contributo richiesto pari a € 252.573,98.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 24 aziende. Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario. La differenza tra il richiesto e l'ammesso è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €25.000,00.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 24 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €238.333,62. Sono state presentate due rinunce dopo la sottoscrizione del contratto. Sono state presentate 13 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per €107.656,63.

Nel 2021 sono state presentate 4 domande di saldo ed emessi 6 elenchi di liquidazione per €46.931,89, purtroppo sono state presentate anche due rinunce e per concludere la graduatoria manca solo la domanda di un'azienda prevista per il gennaio 2022. Le economie che si sono generate anche in questa misura sono state spostate con il Piano finanziario approvato a dicembre che ha visto la Misura con una dotazione di €195.000,00.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	24	252.573,98
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	24	238.333,62
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	19	154.588,52

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"



Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019 con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa, ma le richieste hanno esaurito quasi la dotazione disponibile, inoltre fra le tre misure extra-agricole è sempre stata quella con minor numero di partecipanti, vista la realtà turistica territoriale.

Hanno presentato domanda 16 imprese con una spesa pubblica pari a € 309.479,13, ammissibili per €306.613,31. La differenza è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €50.000,00. A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 16 aziende. Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 16 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €304.096,65. Sono state presentate 5 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione per € 57.425,68.

Nel 2021 sono state presentate 7 domande di saldo e liquidate per € 122.575,73. E' stata presentata una rinuncia. Per concludere la graduatoria manca un'unica azienda, anche in questa misura le economie sono state spostate infatti l'attuale dotazione è pari a € 190.000,00.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	16	€ 309.479,13
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	16	304.096,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	12	180.001,41

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"



Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

Per la Misura 7.5 in data 24 dicembre è stato pubblicato il bando, l'ultimo destinato agli Enti Pubblici, con la precisazione che la dotazione pari a € 349.484,16 sarebbe stata definitivamente a disposizione, solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020.

La partecipazione è stata numerosa ha visto partecipare 29 dei 30 Comuni dell'area e l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina, ma causa ritardi dovuti al periodo l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate prevedono richieste per € 692.830,32 molto superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare che vede l'ammissibilità di 15 domande mentre 15 rimanevano ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.

Nel 2021 a settembre viene approvata la graduatoria definitiva che vede ammessi i 15 Comuni per un contributo pari a € 331.920,06 entro dicembre sono stati sottoscritti 7 contratti e gli altri 8 sono in fase di completamento dei progetti esecutivi, condizione per la sottoscrizione dei rispettivi contratti.

Le economie generatesi nelle diverse misure, hanno fatto sì è stato possibile esaurire la graduatoria anche di questa Misura. Infatti con l'approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Piano finanziario del 6 dicembre avendo dotato la Misura di € 692.000,00 è stato approvato il 23 dicembre dal Consiglio Di amministrazione del Gal il primo e ultimo scorrimento della graduatoria che ha visto ammissibili e finanziari i restanti 15 Comuni.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	€ 692.830,32
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	15	€ 331.730,22
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)		

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso

Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "

Il bando pubblicato in data 16/05/2018 e chiuso il 13/07/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte degli Enti pubblici del territorio elegibile del Gal, ben 26 rispetto ai 30.

Hanno presentato domanda ben 27 Enti di cui 26 ammissibili (il comune di Badia Tedalda per errore aveva presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.515.326,54.

Il consiglio di Amministrazione del 4 settembre, come sopra detto, avendo rivisto la riprogrammazione della dotazione dei bandi tra prima e seconda fase, ha riassegnato € 15.326,54 al bando in modo da poter

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

soddisfare tutte le richieste. A seguito dell'istruttoria il 21 novembre sono stati approvati gli esiti e ammesse tutte e 26 le domande. Sottoscritti i contratti dei 26 Comuni per un importo pari a € 1.496.819,91.

Nel 2020 sono state presentate 18 domande di saldo che si sono andate ad aggiungere alle 5 del 2019. Il Gal ha emesso 20 elenchi di liquidazione per € 974.931,53.

Per la Misura 7.6.1 in data 24 dicembre 2020 è stato pubblicato il bando riferito alla seconda fase con una dotazione pari a € €1.294.486,09 . Il bando prevedeva comunque un incremento complessivo pari a 308.694,00 (€ 28.941,18 derivanti da economie e € 279.699,82 della quota di performance) successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020. La partecipazione è stata numerosa tutti i 30 Comuni dell'area hanno presentato domanda, ma causa ritardi dovuti al periodo, l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate dai 30 Comuni prevedono richieste per e 1.691.076,55 superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare con l'ultima domanda, quella del Comune di Civitella in Val di Chiana a condizione dell'approvazione della rimodulazione del piano finanziario da parte della Regione Toscana che è avvenuta in data 21 dicembre esaurendo così tutte le richieste, portando la misura 7.6.1 complessiva a € 3.158.000,00.

Nel 2021 per la prima fase 5 Comuni hanno presentato domanda di saldo, 4 sono stati liquidati per €258.243,28, uno è in istruttoria. Per concludere questa graduatoria manca solo il Comune di Cortona che ha avuto varie problematiche ma che comunque ha realizzato gran parte dell'investimento e che nel primo semestre 2022 dovrebbe presentare domanda ai saldo.

A marzo 2021 è stata approvata anche la graduatoria definitiva delle domande riferite alla seconda fase e successivamente sono stati sottoscritti 29 contratti dei 30 Comuni ammessi, impegnando un contributo pari a €1.640.980,65. Il Comune di Caprese Michelangelo ha richiesto di attendere giugno 2022 per la sottoscrizione del contratto per problemi riferiti all'approvazione del progetto esecutivo.

A dicembre il Comune di Sansepolcro ha presentato domanda i saldo.

A dicembre è stato approvato anche il bando terza fase dotato delle risorse assegnate per il periodo di estensione, il bando ad oggi prevede €1.000.000,00 che sarà pubblicato nel primo trimestre 2022.

7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi " I fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	26	1.515.326,54
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	26	1.496.819,91
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	1	35.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	24	1.293.178,81

7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi " II fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	1.691.076,55
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	30	1.690.980,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)		

MISURA 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi



Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale "

Il bando pubblicato in data 03/10/2018 si doveva chiudere il 13/12/2018, ma il Consiglio di Amministrazione del 21/11/2019 ha approvato, a seguito di verifiche nel territorio, una proroga al 31/01/2019.

Al 31 gennaio 2019 sono state presentate 25 domande per una spesa pubblica pari a € 1.375.868, a seguito dell'approvazione della preliminare in data 27 marzo, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 16 luglio 2019 ammettendo, per € 1.370.532,58, tutte e 25 le domande presentate, 24 dai Comuni dell'area e una dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Entro dicembre 2019 sono stati sottoscritti 21 contratti gli ultimi 4 sono stati sottoscritti nel corso del 2020 per un totale complessivo di € 1.370.532,58 . Nel 2020 sono state presentate 9 domande di saldo per € 454.516,53 e di questi sono stati emessi 3 elenchi di liquidazione.

Nel 2021 sono stati emessi elenchi di liquidazione delle 6 domande presentate nel 2020 e altri 14 riferite all'anno in corso per un totale liquidato pari a € 993.286,55. Rimangono ancora 2 Comuni che hanno avuto necessità di più tempo per poter concludere l'investimento ed ai quali sono state concesse delle proroghe: Capolona e Marciano della Chiana.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	25	1.375.868,38
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	25	1.370.532,58
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	2	89.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	23	1.105.751,40

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"



Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €920.000,00. La partecipazione è stata numerosa, di gran lunga superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare anche questo bando con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure.

Pertanto anche se ufficialmente non era arrivata la comunicazione dell'elenco delle domande da parte di ARTEA, la verifica puntuale sulle singole domande ha permesso di conoscere il contributo richiesto e quindi poter prevedere la rimodulazione finanziaria delle economie nel piano finanziario che sarebbe stato inviato a gennaio 2020 alla Regione Toscana. Hanno presentato domanda 70 aziende con una spesa pubblica pari a € 2.168.895,50, ammissibili 68 domande per € 2.109.788,00 (due imprese avevano presentato una seconda domanda in sostituzione della prima). Essendo la dotazione del bando pari a € 920.000,0 risultano necessarie, per soddisfare tutte le domande €1.189.788,00

Il Piano Finanziario è stato approvato con DGRT n.183 del 17/02/2020 è così è stata approvata una prima preliminare a marzo che ha visto 46 aziende ammissibili per € 1.370.650,82, 22 domande non finanziabili per carenza di risorse per € 687.993,18 e due domande escluse.

L'approvazione della graduatoria definitiva ad agosto che ha visto 44 aziende ammesse per €1.290.375,48 e due domande sospese per supplemento istruttoria.

L'approvazione di una seconda definitiva a dicembre che ha visto l'approvazione delle due domande sospese per € 72.449,32 e anche una rinuncia delle domande precedentemente ammesse.

Contestualmente a dicembre è stato approvato anche un primo scorrimento subordinato all'approvazione della rimodulazione del Piano finanziario che ha visto la sua approvazione il 21 dicembre con l'incremento nella misura di € 367.890,34, portandola complessivamente a € 1.740.541,31. Il primo scorrimento ha visto pertanto altre 13 aziende fra le ammissibili per € 393.227,98 rimanendone altre 9 ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse per € 294.765,20.

Nel 2021 a febbraio è stata approvata la terza graduatoria definitiva che ha ammesso 9 aziende di queste due hanno rinunciato prima della sottoscrizione del contratto e sempre a febbraio causa economie è stato approvato il 2° scorrimento della graduatoria preliminare dove 5 aziende sono risultate ammissibili, nel corso dell'istruttoria 2 hanno rinunciato così a marzo è stato fatto il terzo e ultimo scorrimento dove sono state ritenute ammissibili e finanziabili le ultime 4 aziende in graduatoria.

A giugno è stata approvata l'ultima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità delle ultime 6 aziende per € 150.729,32. Con quest'ultima approvazione sono state quindi ammesse 58 aziende per un totale di €1.658.190,27 di queste nel corso del 2021 sono stati sottoscritti contratti per €1.656.993,30.

Complessivamente sono state ammesse 61 aziende di cui 59 hanno sottoscritto il contratto e successivamente 1 azienda ha rinunciato post sottoscrizione contratto.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	70	€ 2.168.895,50
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	61	1.758.599,76
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	1	25.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	42	1.105.034,07

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 8.6 ""Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole ...""



4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale

Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente emerse durante l'attuazione degli interventi.

Le criticità emerse fino ad oggi sono principalmente procedurali come sopra esplicitato.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2021

La Misura 19.4 riguarda le risorse destinate ai Gal per le spese di gestione e funzionamento, vengono anticipate dal GAL e successivamente vengono rendicontate al massimo una volta ogni semestre alla Regione Toscana.

Le attività svolte dalla società e dalla struttura del GAL anche per l'anno 2021 hanno confermato quelle degli anni precedenti.

Nel 2021 oltre che per i bandi pubblicati, è proseguita anche l'attività di animazione, rispondendo alle tante richieste ricevute quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione/informazione avvenuta aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook.

Nel 2021 il personale del Gal, come da organigramma allegato, non ha subito variazioni se non quello relativo alla proroga fino al 31/03/2025 dei contratti dei due incaricati dell'accertamento finale e collaudo dei progetti, vista la DGRT n.784 del 02/08/2021, che ha previsto il prolungamento delle attività del GAL al 31/03/2025.

Nell'anno 2021 è stato presentato un unico SAL, corrispondente al sesto stato di avanzamento.

Riepilogando questo l'avanzamento della Misura 19.4:

- il 13/03/2017 è stato richiesto il primo anticipo pari a € 250.000,00 liquidato da ARTEA il 21/04/2017
- il 27/03/2018 presentato la domanda di pagamento del primo saldo parziale per € 276.919,99, annullato dall'Ufficio Territoriale il 17/10/2018 per € 275.165,45 e liquidato da ARTEA il 06/12/2018;
- il 20/12/2018 presentato la domanda di pagamento del secondo saldo parziale per € 133.342,29 approvato dall'Ufficio Territoriale il 28/05/2019 per € 133.158,43 e liquidato da ARTEA il 12/09/2019;
- il 26/06/2019 presentato la domanda di pagamento del terzo saldo parziale per €86.882,47 approvato dall'Ufficio Territoriale il 26/03/2020 per € 86.859,90 e liquidato da ARTEA il 11/05/2020;
- il 20/12/2019 presentato la domanda di pagamento del quarto saldo parziale per € 106.461,83 approvato dall'Ufficio Territoriale il 08/05/2020 per € 106.457,83 e liquidato da ARTEA il 12/08/2020
- il 29/10/2020 presentato la domanda di pagamento del quinto saldo parziale per € 139.386,34 approvato dall'Ufficio Territoriale il 11/05/2021 per € 138.505,10 e liquidato da ARTEA il 28/06/2021;
- il 29/05/2021 presentato la domanda di pagamento del sesto saldo parziale per € 120.284,18 approvato dall'Ufficio Territoriale il 13/10/2021 per € 118.188,70 e liquidato da ARTEA il 16/12/2021;
- Il Gal ha provveduto a presentare una variante alla sottomisura 19.4 in data 15/12/2021 al fine di

adeguare la scheda progetto alle risorse aggiuntive attribuite per oltre €800.000,00 che è in corso di istruttoria.

L'avanzamento della spesa rispetta il business plan approvato con DGRT n. 1308 del 27/11/2018 come dimostrato dalla tabella sottostante infatti le domande di pagamento dei saldi parziali sono inferiori rispetto alla disponibilità cumulata per anno.

Il Gal ad ottobre 2021 ha approvato anche un aggiornamento del business plan a seguito delle comunicazioni inviate dalla Regione Toscana sulle ulteriori risorse relative al periodo di estensione. Il Business Plan è parte integrante della SISL approvata con DGRT 1288 del 06/12/2021, prevedendo la pianificazione della nuova dotazione della Misura 19.4 pari a € 2.025.298,85 come è riscontrabile nella seconda tabella che segue.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

BUSINESS PLAN SPESE RENDICONTABILI								
Periodo 01/08/2016 - 31/03/2022								
Tipologia di spese	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
Spese per il personale	43.535,56	147.383,07	162.407,84	153.000,00	153.000,00	153.000,00	29.000,00	841.326,47
- di cui per attività di animazione ed acquisizione di competenze	32.014,13	97.551,71	109.407,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	19.000,00	557.973,68
Rimborsi spese (personale e amministratori escluso animatori)	731,05	2.174,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	15.405,58
Spese per formazione e aggiornamento del personale		60,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00			4.060,00
Acquisto o noleggio arredi, attrezzature e dotazioni d'ufficio. Hardware & Software			2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Spese correnti (affitto locali, utenze, pulizie, cancellerie, assistenza informatica, lavoro, contabilità, bilancio.....)	10.087,04	33.833,37	45.000,00	45.000,00	42.000,00	36.000,00	3.000,00	214.920,41
Spese societarie (oneri, tributi, diritti, notaio, imposte e tasse)	182,44	834,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	246,72	5.264,03
Consulenze specialistiche: Accertamento finale			2.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00		50.000,00
Spese per consulenze professionali (notaio, sindaci, consul societaria, ecc.)	2.155,05	4.337,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	27.992,95
Spese per piano valutazione ..materiale informativo (sito, depliant...)			5.000,00		1.000,00	1.000,00		7.000,00
Spese bancarie ed assicurative (fidjussione, gestione cc, assicurazioni locale sede...)	2.069,59	4.343,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	23.413,40
TOTALE	58.760,73	192.967,55	231.407,84	230.000,00	230.000,00	220.000,00	35.246,72	1.198.382,84
TOTALE incrementale	58.760,73	251.728,28	483.136,12	713.136,12	943.136,12	1.163.136,12	1.198.382,84	

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

BUSINESS PLAN SPESE RENDICONTABILI											
Periodo 01/08/2016 - 31/03/2025											
Tipologia di spese	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Spese per il personale	43.535,56	147.383,07	162.407,84	153.000,00	153.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	45.000,00	1.371.326,47
- di cui per attività di animazione ed acquisizione di competenze	32.014,13	97.551,71	120.000,00	111.000,00	111.000,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.725,68	34.454,41	1.005.745,93
Rimborsi spese (personale e amministratori escluso animatori)	731,05	2.174,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	25.405,58
Spese per formazione e aggiornamento del personale		60,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.560,00
Acquisto o noleggio arredi, attrezzature dotazioni d'ufficio. Hardware & Software			2.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		43.000,00
Spese correnti (affitto locali, utenze, pulizie, cancellerie, assistenza informatica, lavoro, contabilità, bilancio.....)	10.087,04	33.833,37	45.000,00	45.000,00	42.000,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00	18.000,00	361.920,41
Spese societarie (oneri, tributi, diritti, notaio, imposte e tasse)	182,44	834,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	20.017,31
Consulenze specialistiche: Accertamento finale			2.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00		14.162,73			64.162,73
Spese per consulenze professionali (notaio, sindaci, consul societaria, ecc.)	2.155,05	4.337,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.492,95
Spese per piano valutazione ..materiale informativo (sito, depliant...)			5.000,00		1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		37.000,00
Spese bancarie ed assicurative (fidjussione, gestione cc, assicurazioni locale sede...)	2.069,59	4.343,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	42.413,40
TOTALE	58.760,73	192.967,55	231.407,84	230.000,00	230.000,00	235.500,00	251.000,00	272.162,73	250.000,00	73.500,00	2.025.298,85
Totale Incrementale	58.760,73	251.728,28	483.136,12	713.136,12	943.136,12	1.178.636,12	1.429.636,12	1.701.798,85	1.951.798,85	2.025.298,85	

Gli importi inseriti nella colonna "assegnato" sono quelli del Piano Finanziario approvato con DGRT n.1308 del 27/11/2018

Anno	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	Importo	Importo	Importo	Importo
2016	383.613,34			
2017	298.909,47			
2018	171.603,72	250.000,00	275.165,45	
2019	171.944,67		133.158,43	
2020	172.311,63		193.317,73	
2021			256.693,80	
2022				
Totale	1.198.382,84	250.000,00	858.335,41	

Gli importi inseriti nella colonna "assegnato" sono quelli del Piano Finanziario approvato con DGRT n.1288 del 06/12/2021

Anno	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	Importo	Importo	Importo	Importo
2016	461.547,33			
2017	359.635,22			
2018	200.271,30	250.000,00	275.165,45	
2019	200.671,09		133.158,43	
2020	201.098,69		193.317,73	
2021	275.831,69		256.693,80	
2022	326.243,52			
Totale	2.025.298,85	250.000,00	858.335,41	

5.1 Spese non rendicontabili

Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020.

Il Gal Appennino Aretino svolge esclusivamente Attività LEADER, per quanto riguarda le spese non rendicontabili, in data 29/06/2016, il Consiglio di Amministrazione ha assunto una delibera, approvando per il periodo 2016-2022 la pianificazione del cofinanziamento soci, una quota che annualmente ogni socio versa per le spese di funzionamento della società. In data 29/09/2021 ha aggiornato tale pianificazione al 2025 in ottemperanza alla DGRT 784 del 02/08/2021 che ha previsto la proroga dei termini per l'attività dei Gal dal 31/03/2022 al 31/03/2025.

Di seguito la pianificazione approvata:

COFINANZIAMENTO SOCI periodo 2016-2025										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Soci										
Unione Montana Casentino	3.060,68	3.121,89	3.184,33	3.248,02	3.312,98	3.379,24	3.446,82	3.550,22	3.656,73	3.766,43
Unione Montana Valtiberina	1.620,36	1.652,77	1.685,82	1.719,54	1.753,93	1.789,01	1.824,79	1.879,53	1.935,92	1.994,00

Unione Montana Pratomagno	720,16	734,56	749,25	764,24	779,52	795,11	811,02	835,35	860,41	886,22
Comuni Val D'Ambr - Bucine	1.440,32	1.469,13	1.498,51	1.528,48	1.559,05	1.590,23	1.622,03	1.670,69	1.720,81	1.772,44
Comune di Cortona	1.351,38	1.378,41	1.405,98	1.434,10	1.462,78	1.492,03	1.521,87	1.567,53	1.614,55	1.662,99
Comune di Castiglion Fiorentino	527,37	537,92	548,68	559,65	570,85	582,26	593,91	611,73	630,08	648,98
Comune di Marciano della Chiana	136,97	139,71	142,51	145,36	148,27	151,23	154,26	158,89	163,65	168,56
Comune di Lucignano	144,75	147,65	150,6	153,61	156,68	159,82	163,01	167,90	172,94	178,13
Parco Nazionale	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CCIAA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CIA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Coldiretti	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confagricoltura	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Industriali	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CNA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confartigianato	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confesercenti	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confcommercio	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
ARA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
TOTALE GENERALE	14.999,96	15.300,02	15.605,98	15.918,04	16.236,48	16.561,15	16.892,37	17.399,14	17.921,12	18.458,75

Al 31/12/2021 risulta che i soci hanno versato € 84.439,29;

Il Gal Appennino Aretino può contare altresì, come da Bilancio d'esercizio 2021, su un patrimonio netto che ammonta a € 137.025,00. Il patrimonio è costituito anche dal capitale sociale (€ 78.070,00) e da un fondo di riserva copertura perdite future (€ 20.677,00).

6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

6.1 Animazione sul territorio

Il GAL Appennino Aretino, visto il perdurare della pandemia anche per tutto il 2021, ha limitato molto l'attività relativa all'organizzazione di incontri ed azioni informative di animazione sul territorio mediante contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati. Ha sospeso quindi anche i collaudi in loco e tutte quelle attività che fanno parte della gestione ordinaria della SISL. Sono state adottate necessariamente misure diverse per accompagnare ed assistere il territorio ed in particolare i beneficiari.

Sono stati infatti intensificati contatti telefonici, web-conference, informative sui social, attraverso la mailing list del Gal e gli strumenti/canali di informazione che il Gal ha scelto per informare ed essere vicini al territorio.

L'animazione pertanto è stata svolta nei confronti di:

- Enti del territorio, nei periodi di uscita dei bandi per segnalare le opportunità di finanziamento disponibili ed informare sulle modalità di accesso agli aiuti;

- Aziende ed Enti beneficiari per fornire indicazioni in fase di attuazione e durante tutta la vita del progetto fino al loro collaudo.
L'animazione è l'attività principale del GAL che occupa quotidianamente la struttura tecnica, si rimanda al successivo paragrafo 6.2 "Pubblicità degli interventi" per un'analisi dei dati.

6.2 Pubblicità degli interventi

Per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2020 della Regione Toscana, il Gal Appennino Aretino ha elaborato una STRATEGIA DI COMUNICAZIONE che risulterà poi parte integrante delle attività di valutazione. E' necessario per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari, la collettività e gli organi decisori politici operanti nell'area LEADER.

Nella nostra SISL è previsto che "La comunicazione interna sarà indirizzata ai soci pubblici e privati del GAL. Attraverso riunioni ed incontri sarà promossa l'attività del GAL per l'efficace attuazione della Strategia. Altresì, saranno attivate azioni di comunicazione esterna anche attraverso l'ausilio di stampa e TV locali e WEB ed in particolare tramite il sito internet del GAL Appennino Aretino www.galaretino.it. Il sito web del Gal diventa il canale di informazione per eccellenza, aggiornato in tempo reale sui diversi momenti dell'attività, consente una partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti..."

Di seguito gli indicatori che il Gal si prefigge di raggiungere a fine programmazione

Set indicatori di risultato (efficacia)

Indicatori	Unità di misura	Risultato atteso
Grado di conoscenza da parte dei cittadini dell'esistenza della SISL e indirettamente del PSR Toscano 2014 – 2020	% sulla popolazione area Gal	30
Grado di conoscenza da parte dei cittadini circa il ruolo svolto dall'UE, dallo Stato e dalla Regione tramite l'attività del Gal nello sviluppo dei territori rurali	% sulla popolazione area Gal	50
Grado di conoscenza da parte dei destinatari degli interventi dell'esistenza della SISL	% sul totale delle imprese attive/Enti	60
Grado di conoscenza da parte dei destinatari degli interventi circa il ruolo svolto dall'UE, dallo Stato e dalla Regione tramite l'attività del Gal nello sviluppo dei territori rurali	% sul totale delle imprese - attive	80

Set indicatori di realizzazione (efficienza)

Attività	Indicatore	Unità di misura	Risultato atteso
Campagne di comunicazione	Campagne realizzate	n.	2
	Comunicati stampa ed editoriali su quotidiani e periodici	n.	20
	Spot radiofonici e televisivi realizzati	n.	4
	Social media: visualizzazioni	n.	300
Ipotetici contatti attivati con le campagne di comunicazione (social media, radio e tv locali)	Numero medio di condivisioni dei contenuti dello speciale sui principali social media	n.	1.000
Newsletter on line	Newsletter pubblicate	n.	12
	Iscritti alla newsletter	n.	200

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Rapporti con i media	Comunicati stampa prodotti	n.	30
	Conferenze stampa organizzate	n.	2
Sito Web dedicato	Pagine editate	n.	30
	Accessi medi mensili	n.	300
Eventi, Convegni, seminari, incontri	Partecipanti	n.	50

Di seguito gli strumenti che il Gal ha programmato per far sì che la propria comunicazione sia efficace ed efficiente in termini sia di realizzazione che di risultato.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE ATTIVATI DAL GAL APPENNINO ARETINO

		TARGET	PERIODICITA'	OGGETTO
 WWW.GALARETINO.IT	 IN EVIDENZA	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	IN CASO DI NECESSITA'	TITOLI E ARGOMENTI IN BREVE NELLA HOMEPAGE CHE RIMANDANO A PAGINE DEDICATE
	...GAL INFORMA... 	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	ATTIVITÀ SISL	COMUNICATI STAMPA DEL GAL APPENNINO ARETINO
	 NOTIZIE ...DA ...E PER LO SVILUPPO RURALE	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	MENSILE PRIMA SETTIMANA	ARGOMENTI PER IL TERRITORIO SULLO SVILUPPO RURALE COMUNICATI STAMPA PRODOTTI DA ALTRI
	 PAGINE FACEBOOK		OGNI QUALVOLTA SI INSERISCONO PAGINE INTERESSANTI	ARGOMENTI INTERESSANTI SU CUI SI VUOLE UN RITORNO
 NEWSLETTER	DAL 15/12/2016	CITTADINANZA	MENSILE	NOTIZIE IN PILLOLE SULLA SISL

 <p>IL GAL NEL WEB</p>	<p>DA FEBBRAIO 2018</p>	<p>CITTADINANZA</p>	<p>MENSILE</p>	<p>INTERVISTE VIDEO DA PUBBLICARE NEL SITO E IN FACEBOOK</p>
 <p>FACEBOOK</p>	<p>DAL 14/12/2017</p>	<p>IL MONDO</p>	<p>AGGIORNAMENTO CON NUOVI POST GIORNALIERI/ SETTIMANALI</p>	
 <p>SCHEDE DI RILEVAMENTO,</p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>PRESSO LA SEDE O CONTATTO TELEFONICO</p>	<p>COMPILAZIONE SCHEDA</p>
 <p>Relazioni EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI</p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>DA CONCORDARE IN RIFERIMENTO ALL'ARGOMENTO TRATTATO</p>	<p>IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI SI PRODUCONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESENTAZIONI • COMUNICATI STAMPA • PIEGHEVOLI • DOCUMENTI VARI

INDICATORI di RISULTATO Anno 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

In numeri ...

Sito Web	Gal Informa (comunicati stampa prodotti)	12
	Notizie da e per lo Sviluppo economico (articoli del territorio diffusi)	13
	Il Gal nel web	13
Newsletter	Newsletter pubblicate	11
	Utenti raggiunti complessivamente	9397
	Iscritti alla newsletter del sito	14
Schede di rilevamento richieste specifiche	settore commercio (e beneficiari 6.4.4)	30
	settore artigianato (e beneficiari 6.4.3)	35
	settore turismo (e beneficiari 6.4.5)	60
	settore agricolo (e beneficiari 4.1.1 e 6.4.1)	106
	settore forestazione (e beneficiari 8.6)	114
	settore pubblico (e beneficiari 7.5-7.6.1-7.6.2)	387
Facebook	post	52
	copertura	1666
	like	65
	unlike	0
	Condivisioni	0
Rapporti media	contatti testate giornalistiche	61*
	Comunicati stampa prodotti	8
	Articoli pubblicati	11

*è il numero delle testate giornalistiche a cui sono stati inviati n° comunicati stampa

Un resoconto ... che cresce

INIZIO CONTEGGIO 26/06/2018 : prima il sistema non permetteva la visualizzazione del numero visite

VISITE delle sezioni	26/06/2018		26/10/2018		20/12/2018		26/03/2019		30/06/2019		19/12/2019		30/10/2020	
	totale		totali	periodo										
GAL INFORMA	1737		2224	487	2501	277	2998	497	3373	375	3776	403	4882	1106
NOTIZIE DA... A	10699		11660	961	12080	420	12906	826	15037	2131	15900	863	17770	1870
NEWSLETTER	1127		1489	362	1689	200	2126	437	2655	529	2954	299	3547	593
GAL NEL WEB	522		1018	496	1346	328	2024	678	2815	791	3163	348	3971	808
RASSEGNA STAMPA	259		609	350	803	194	1221	418	1604	383	1755	151	2077	322
Totali	14344		17000	2656	18419	1419	21275	2856	25484	4209	27548	2064	32247	4699

VISITE	28/05/2021		30/06/2021		30/09/2021		15/12/2021	
	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo
GAL INFORMA	6602	1720	6382	220	6749	367	7118	369
NOTIZIE DA... A	19366	1596	19590	224	19928	338	20207	279
NEWSLETTER	3870	323	3926	56	3999	73	4032	33
GAL NEL WEB	4542	571	4753	211	5031	278	5155	124
RASSEGNA STAMPA	2237	160	2270	33	2304	34	2312	8
Totali	36617	4370	36921	744	38011	1090	38824	813

...dalle pagine del nostro sito

In questo anno 2021 è stata confermata la validità del sistema di “comunicazione” messo in campo infatti si può evidenziare un incremento dei contatti e di interesse nei confronti dell’attività del Gal. Ovviamente questo è determinato anche dalla pubblicazione degli ultimi bandi della programmazione della SISL e dalle graduatorie definitive di concessione del contributo.

... a Facebook

ANNO 2021		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	
facebook	post	2	5	6	6	7	5	3	1	5	4	4	4	52
	copertura	64	53	93	94	97	91	59	25	119	81	779	111	1666
	like	3	4	8	5	9	7	4	1	5	4	6	9	65
	unlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	condivisioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Il GAL Appennino Aretino nell'esercizio della sua attività istituzionale di gestione della Misura 19.2 LEADER del PSR 2014/2020 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

In relazione alla Misura 19.4 il GAL ha adottato un regolamento interno che definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale del GAL APPENNINO ARETINO, che opera per attuare la propria attività secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.

Detto Regolamento è predisposto in conformità:

- al Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022;
- alla Legge 241/90 e ss.mm.ii e del DPR 445/00 e ss.mm.ii;
- al DPR n.118/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica";
- al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'acquisizione di forniture e servizi;
- al D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- alla L.244/2007 e ss.mm.ii. concernente la pubblicazione degli incarichi esterni assegnati;
- alla relazione Speciale n.5 del 2010 della Corte dei Conti Europea e all'applicazione della Determinazione dell'Autorità Anti Corruzione n.8 del 2015"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza...";
- al Decreto Dirigenziale n.1730 del 04/04/2016 Allegato A - "Disposizioni Generali per l'attivazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"; (di seguito indicato come Disposizioni Generali);
- alla DGRT n. 784 del 02/08/2021 "...Individuazione del nuovo termine per la presentazione di modifiche della SISL e modifica delle scadenze di cui all'art.11 dell'allegato A del DD n.1730/2016";
- alle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento Decreto Direttore Artea n.144 del 24/11/2021 e ss.mm.ii (di seguito Disposizioni);
- Alle "Direttive per la gestione della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" DGRT n.1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii.;
- Alla normativa nazionale e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine alla protezione dei dati personali

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento, il GAL ha costituito mediante avviso pubblico apposito elenco degli operatori economici aperto a tutte le imprese interessate.

Il GAL ha inoltre ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la tracciabilità degli stessi in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e dell'inserimento dello stesso in tutte le comunicazioni, documenti di spesa, documenti di pagamento riferite ad ogni singolo procedimento.

Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici.

Per quanto riguarda infine la tutela e il miglioramento dell'ambiente, promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti - quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere

8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Il Gal Appennino Aretino nella propria Strategia, aveva previsto l'attivazione della Misura 19.3, ma visto che con DGRT n.1243 del 05/12/2016 erano state assegnate ai Gal le risorse per l'attuazione della SISL, decurtando quelle riferite alla riserva obbligatoria del 6%, questa misura 19.3 era stata "congelata", con l'intensione di attuarla in un secondo tempo rispetto alle misure di sviluppo locale.

In realtà al momento della riassegnazione delle risorse e relativa rimodulazione del piano finanziario è stato deciso di annullare la Misura 19.3 in quanto il tempo a disposizione per la sua attuazione diventava non sufficiente per un progetto complesso come prevede la misura di cooperazione. Tuttavia il Gal attuerà la Misura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala" destinata agli enti del territorio quali i Comuni, Unione dei Comuni e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La misura manterrà obiettivi finalità del progetto di cooperazione nonostante siano progetti locali e non di partenariato con altri Gal.

9. MONITORAGGIO

Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario.

Il GAL svolge un'attività di monitoraggio continua che riguarda la raccolta di dati quantitativi che servono a seguire ed accompagnare l'attuazione del programma sia da un punto di vista procedurale che finanziario oltre ad essere utilizzati anche per valutarne i risultati.

Il GAL invia mensilmente il monitoraggio su modello predisposto dalla Regione Toscana (vedi allegato 3) che evidenzia i progressi fisici e finanziari per ciascuna misura programmata nella SISL.

Il Gal inoltre ha pianificato contestualmente un monitoraggio interno dove sono stati individuati indicatori specifici per ogni misura. I dati vengono raccolti nelle diverse fasi procedurali : nella domanda iniziale, in istruttoria e nel corso di vita del progetto fino alla domanda di saldo finale e liquidazione del contributo.

I diversi momenti di raccolta dei dati servono sia per controllare e seguire l'andamento del progetto

finanziato e quindi della SISL, che per essere elaborati ed utilizzati nei diversi documenti che il Gal predispone come il presente RAE, casi studio, buone prassi e Valutazione.

10.VALUTAZIONE

Il GAL Appennino Aretino ha da tempo intrapreso un'attività di monitoraggio e valutazione finalizzata a sostenere il processo decisionale ed accertare i risultati della SISL e dell'operato del GAL.

Infatti in moltissime occasioni il GAL ha raccolto ed elaborato informazioni su interventi già realizzati ed ancora in corso di realizzazione utilizzando i dati raccolti per la gestione, il controllo e la dimostrazione dell'avanzamento del programma. Questa attività ha assunto nel tempo un'importanza crescente per il GAL che, a seguito dell'audit della Corte dei Conti Europea di una settimana nel 2009, ha acquisito la consapevolezza che il monitoraggio riguarda gli aspetti quantitativi e consente di controllare la traiettoria ma solo con valutazione si individuano sia gli effetti programmati che quelli inattesi.

Per questo il GAL ha pianificato un processo di raccolta dati finalizzato alla valutazione inserito nell'attività di animazione continua adottando gli strumenti e modalità descritti nei paragrafi precedenti.

Le attività svolte dal GAL sono state integrate con l'attività di valutazione organizzata dalla Regione Toscana nell'ambito del PSR, avviata nel 2019 e sviluppata nel 2020, che si è conclusa alla fine di febbraio 2021.

Le attività di rilevazione hanno previsto attività comuni che hanno coinvolto il Valutatore, i GAL toscani e l'Autorità di Gestione, in giornate dedicate al coaching e sessioni valutative comuni realizzate mediante focus group e workshop. Tali attività sono state eseguite da remoto tenendo conto delle limitazioni imposte dalla pandemia COVID 19. Nel dettaglio sono stati svolti:

- Workshop: n.2 rivolti al personale di tutti i GAL (in concomitanza con due dei focus group).
- Focus Group: n.4 rivolti a tutti i GAL tesi ad approfondire temi comuni e gli esiti dei workshop valutativi.
- Azioni di coaching individuali e di gruppo per fornire il supporto ai GAL nella costruzione del modello di autovalutazione.

Allegati

- Allegato 1: Descrizione del GAL
- Allegato 2: Struttura organizzativa
- Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2021
- Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2021
- Allegato 5: Dichiarazione legale rappresentate
- Allegato 6: Comunicazione e Informazione

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 1 Dati societari del GAL

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:

Tabella 1: Elenco dei soci

n	Denominazione del socio	Pubblico/Privato/Altro*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
1	Comunità Montana Casentino	Pu	6.881,19	8,81%
2	Comunità Montana Valtiberina	Pu	6.881,19	8,81%
	Comunità Montana Pratomagno	Pu	6.881,19	8,81%
3	Comune di Marciano in Val di Chiana	Pu	767,72	0,98%
4	Comune di Cortona	Pu	3.634,33	4,66%
5	Comune di Castiglion Fiorentino	Pu	1.644,67	2,11%
6	Comune di Lucignano	Pu	834,87	1,07%
7	Comune di Bucine	Pu	6.881,19	8,81%
8	Parco Nazionale Foreste Casentinesi	Pu	6.881,19	8,81%
9	CCIAA di Arezzo	Pu	8.306,88	10,64%
10	Confederazione Italiana Agricoltori Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
11	Federazione Provinciale Coldiretti Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
12	Confagricoltura	Pr	3.167,69	4,06%
13	Associazione Industriali Provincia di Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
14	CNA Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
15	Confartigianato Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
16	Confesercenti Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
17	Associazione Commercianti Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
18	Associazione Aretina Allevatori	Pr	3.162,15	4,05%
			78.069,63	100,00%

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%):64%

Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000 SI

NO

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica dal 09/01/2020:

n	Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
1	Sandro SASSOLI	Unione Comuni Montani del Casentino	Presidente (Pu)
2	Giorgio DEL PACE	CIA Arezzo	Vicepresidente (Pr)
3	Ivo Romeo BOBINI	CNA Arezzo	Consigliere (Pr)
4	Laura CACCIALUPI	Associazione Industriali Arezzo	Consigliere (Pr)
5	Roberta CASINI	Comune di Lucignano	Consigliere (Pu)
6	Lidia CASTELLUCCI	Coldiretti Arezzo	Consigliere (Pr)
7	Giordano CEROFOLINI	Confartigianato Arezzo	Consigliere (Pr)
8	Mario CHECCAGLINI (dimesso il 13/04/2021) Marco ALTERINI (nominato il 29/09/2021)	Confesercenti Arezzo	Consigliere (Pr)
9	Catiuscia FEI	Associazione Commercianti Arezzo	Consigliere (Pr)
10	Gianluca GHINI	Confagricoltura Arezzo	Consigliere (Pr)
11	Alfredo Provenza	Camera di Commercio di Arezzo	Consigliere (Pu)
12	Elia RENZI	Unione dei Comuni del Pratomagno Comuni Val d'Ambra	Consigliere (Pu)
13	Alfredo ROMANELLI	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina	Consigliere (Pu)

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra elencato è composto da 5 soggetti in rappresentanza di Enti Pubblici e 8 in rappresentanza di Associazioni di categoria economiche. Pertanto oltre il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione proviene da autorità non pubbliche.

Conflitto di interessi

Il Regolamento interno del GAL all'art. 6 disciplina la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse come segue:

6.CONFLITTO DI INTERESSI

Il Gal seguirà le seguenti modalità operative relativamente al conflitto di interessi.

Si ricade nel conflitto di interessi qualora si presentino: situazioni che riguardino coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A.

6.1 Consiglio di Amministrazione

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

6.2 Personale

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione della SISL non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR.

E' obbligo infatti di ogni collaboratore produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, l'elenco dei propri committenti che potrebbero incorrere in detta condizione.

Di norma l'incaricato deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari per ciascun bando.

Nel qual caso si verificasse tale condizione, il rappresentante legale emetterà apposito provvedimento nei confronti dell'incaricato che non dovrà avere alcun contatto con detto richiedente/beneficiario all'interno dell'attività del GAL.

6.3 Consulenti esterni

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.

Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

Sul piano operativo in ottemperanza alle disposizioni regionali ed al Regolamento interno vengono adottate le seguenti misure:

- Ogni componente la struttura permanente del GAL ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo ai componenti la struttura permanente la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata;
- Ogni componente la Commissione Istruttoria – all'insediamento della Commissione stessa – comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle graduatorie preliminari da istruire;
- In sede di approvazione da parte del CdA delle graduatorie preliminari e definitive, si allontanano dalla seduta i consiglieri in situazione di potenziale conflitto diretto o indiretto. Questa circostanza è regolarmente verbalizzata.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

- L'incaricato esterno per l'accertamento finale dei progetti ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata. Inoltre al momento dell'affidamento dei progetti da accertare comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- Oltre a quanto sopra ogni operatore inserisce sul sistema ARTEA la dichiarazione sul conflitto di interesse come richiesto dal sistema stesso.

**Allegato 2
Struttura organizzativa**

Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2021

	Nome e cognome	Ruolo	Contratto	Importo*	(%) 19.4
n		<i>Direttore/animatore/</i>	<i>Td/Piva/Co co Co/</i>		
1	Rita Molli	RTA	Tempo indeterminato	61.675,12	100%
2	Simona Coianiz	Animatore	Tempo indeterminato	47.104,55	100%
3	Marina Morini	Animatore	Tempo indeterminato Part time 25 ore	18.238,56	100%
4	Alfonso Ornani	Animatore	Tempo indeterminato Part time 30 ore	23.077,77	100%

*.Costo azienda

Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2021

	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
n				
1	Daniele Menabeni	Collaudatore	n.8 del 27/06/2018 e n.14 del 29/09/2021 per proroga	€ 150,00 a progetto collaudato
2	Filippo Plotegher	Collaudatore	n.13 del 16/07/2019 e n.14 del 29/09/2021 per proroga	€ 140,00 a progetto collaudato

Progetti collaudati fino al 31/12/2019

Menabeni Daniele	n.4 per € 600,00
Plotegher Filippo	n.4 per € 560,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2020

Menabeni Daniele	n. 38 per € 5.700,00
Plotegher Filippo	n. 35 per € 4.900,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2021

Menabeni Daniele	n. 54 per € 8.100,00
Plotegher Filippo	n. 38 per € 5.320,00

Utilizzare il modello di file .xls per il monitoraggio mensile predisposto dagli uffici regionali

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 4 Piano finanziario consolidato al 31.12.2021

Approvato con DGRT 1288 del 06/12/2021

Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali¹

¹ Inserire il piano finanziario vigente al 31/12/2021, ossia comprensivo delle modificazioni apportate....

**Allegato 5
DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto SASSOLI SANDRO
in qualità di rappresentante legale del GAL Consorzio Appennino Aretino
con sede legale in Capolona, Via dante 74,q
codice fiscale SSSSDR52L21G879C

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, approvato dal Cda il 29/03/2021 con Deliberazione n.05 e nei relativi allegati, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Capolona, 12/05/2022

IL DICHIARANTE

Sandro Sassoli

ALLEGATO 6 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Nel file excel compilato sono stati riportati i link presenti nel sito del Gal Appennino Aretino dove si possono visionare le sezioni sotto indicate comprese nel Piano di Comunicazione descritto al punto 6 precedente.



Sei qui: [Home](#) | Comunicazione e Informazione

 Animazione

Comunicazione e Informazione

Il GAL Appennino Aretino nella propria Strategia ha previsto un "Piano di Comunicazione" per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari e la collettività delle opportunità di finanziamento che metterà a Bando, con le risorse del PSR toscano, nel corso della Programmazione LEADER 2014-2020.

Il Piano ha il compito anche di evidenziare i risultati raggiunti con queste risorse illustrando a tutti i cittadini il ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Toscana che si adoperano per lo sviluppo dei territori rurali attraverso l'attività del GAL.

In breve gli obiettivi sono:

- 1) far conoscere il Programma di Sviluppo Rurale a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio ed ai partner;
- 2) fornire ad attuali e potenziali beneficiari, oltre ai partner di settore, informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- 3) rendere noti a tutti i potenziali beneficiari, le opportunità di cofinanziamento, i contributi del FEASR e le modalità per l'accesso ai contributi;
- 4) informare tutta la popolazione dell'area in merito alle realizzazioni e ai risultati ottenuti grazie agli aiuti garantiti dal Gal Appennino Aretino.

La comunicazione costituirà un impegno importante per il GAL affinché più persone possibili siano informate sulle modalità operative degli interventi finanziati con il PSR, creando le condizioni per un accesso trasparente e semplificato. L'obiettivo non è solo informare chi potrebbe essere interessato al finanziamento, ma raggiungere anche il singolo cittadino affinché conosca l'attività del GAL qual'è il suo ruolo e quanto è utile al territorio.



A tal fine il GAL ha scelto questi strumenti

Categorie

 GAL Informa

 Facebook

 Il GAL nel web

 Newsletter

 Notizie...da e per lo sviluppo rurale...

 Rapporti con i media
